



**AUDITORIA ESTAT DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS SISTEMES
INSTAL·LATS DE PROTECCIÓ ANTICAIGUDES EN ELS CENTRES DE
TREBALL I ESPAIS VERDS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA**

EXPEDIENT 24/0160

NOVEMBRE 2024

INDEX

Talussos Bessos (Ronda Litoral E.24 (Lado Mar))	pag 1
Talussos Bessos (PARC CENTRAL POBLENOU (Pou del Mon))	pag 3
Talussos Bon Pastor-Trinitat (Bon pastor. Camp del Ferro)	pag 11
Talussos Bon Pastor-Trinitat (Av Meridiana-Pg Santa Coloma)	pag 13
Talussos Bon Pastor-Trinitat (Av Meridiana- Crtra Ribes (Lado Llobregat))	pag 15
Talussos Bon Pastor-Trinitat (Av Meridiana- Crtra Ribes (Lado Besos))	pag 17
Talussos Bon Pastor-Trinitat (Plaça de la Primavera)	pag 19
Talussos Canyelles-Prosperitat (Via Favencia (Costat CMC))	pag 21
Talussos Canyelles-Prosperitat (c/ Miguel Hernandez con Federico Garcia Lorca)	pag 23
Talussos Castell de Montjuic (Castell de Montjuic (MERLETS 2)) (IZQ. PUERTA)	pag 25
Talussos Castell de Montjuic (Castell de Montjuic (MERLETS 3))	pag 33
Talussos Castell de Montjuic (Castell de Montjuic (MERLETS 4))	pag 35
Talussos Castell de Montjuic (Castell de Montjuic (MERLETS 5))	pag 37
Talussos Castell de Montjuic (Castell de Montjuic (MERLETS 6))	pag 39
Talussos Castell de Montjuic (Castell de Montjuic (MERLETS 7))	pag 41
Talussos Castell de Montjuic (Castell de Montjuic (MERLETS 8))	pag 43
Talussos Castell de Montjuic (Castell de Montjuic (MERLETS 8))	pag 43
Talussos Castell de Montjuic (Castell de Montjuic (MERLETS 1))	pag 45
Talussos Castell de Montjuic (Castell de Montjuic (MERLETS 2)) (DER. PUERTA)	pag 58
Talussos Ciutat Meridiana (C/Agudes -C/Costabona (escales))	pag 62
Talussos Ciutat Meridiana (Balconeras Biblioteca)	pag 66
Talussos Ciutat Meridiana (Terraza Biblioteca)	pag 70
Talussos Ciutat Meridiana (Parterres Rasos de Peguera (1))	pag 72
Talussos Ciutat Meridiana (Parterres Rasos de Peguera (2))	pag 74
Talussos Ciutat Meridiana (Parterres Rasos de Peguera (3))	pag 76
Talussos Ciutat Meridiana (Parterres Rasos de Peguera (4))	pag 78
Talussos Creueta del Coll (Mare de Deu dels Angels (TEIXONERA))	pag 80
Talussos (Anella Olimpica) (C/ Jocs del 92 (Baseball))	pag 84
Talussos (Anella Olimpica) (FCC Alts Forns (La vinya) CAMPO DAMM)	pag 86
Talussos (Anella Olimpica) (FCC Plaça Teresa Claramunt)	pag 88
Talussos (Estacio de Nord) (Via Favencia (Costat CMC))	pag 92
Talussos (Estacio de Nord) (Parc de l'estacio del Nord)	pag 94



Talussos Front Litoral (Caseta Jardiniers (Canopia))	pag 96
Talussos Front Litoral (Salvador Espriu con Jaume Vicenç Vives (Mc Donalds))	pag 100
Talussos Guinardo (C/ Feijoo con c/ Murtra)	pag 102
Talussos Guinardo (c/ Murtra i c/ Santuari (ZONA ASCENSOR))	pag 108
Talussos Guinardo (Caseta Jardiniers (MAS RAVETLLAT))	pag 110
Talussos Montbau Sant Genis (Jardins Idumea)	pag 114
Talussos Montbau Sant Genis (Jardins Can Soler)	pag 116
Talussos Parc Central de Nou Barris (Jardins Constancia)	pag 120
Talussos Parc Central de Nou Barris (C/ Mont-ral (lateral Rda de Dalt))	pag 122
Talussos Parc de la Guineueta (Jardi Vertical (Costat caseta))	pag 124
Talussos Parc de la Oreneta (Rda de Dalt-Pomaret-Iraider)	pag 128
Talussos Park Güell (Mirador de la baixada de Gloria)	pag 132
Talussos Park Güell (Baixada de la Gloria- Coll del Portell)	pag 134
Talussos Pla de Fornells (Parque Rodrigo Caro (TODOS LOS PARTERRES))	pag 136
Talussos Canyelles-Prosperitat (Carretera Forestal- Passeig del Bosc)	pag 138
Talussos Canyelles-Prosperitat (De Ballot - Mina de la Ciutat (escales))	pag 140
Talussos Canyelles-Prosperitat (Plaça Roquetes (Costat Parquing))	pag 142
Talussos Canyelles-Prosperitat (Passeig del Bosc (Cami superior parquing))	pag 144
Talussos Putxet (C/ Claudi Sabadell-Republica Argentina)	pag 146
Talussos Tamarita (Jardins M.Rodoreda (pl. c/ de la costa))	pag 148
Talussos Turó de la Peira (Pl i Molist Jardi Vertical)	pag 150
Talussos Vall d'Hebron (Mare de deu dels Angels 101, 104)	pag 152
Talussos Vall d'Hebron (Escala dels Canadencs)	pag 156
Talussos Parc de les Aigües del Guinardó (Plaça Ramon Casellas)	pag 160
Talussos Parc de les Aigües del Guinardó (Parc de Pla i Armengol)	pag 162
Talussos Parc de les Aigües del Guinardó (Jardins Frederica Montseny)	pag 166
Talussos Parc de les Aigües del Guinardó (Jardins Hiroshima)	pag 168
Talussos Parc de les Aigües del Guinardó (C/ Telegraf)	pag 170

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS BESOS

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1	LINEA DE VIDA	85010-00 QA11H9		75 m APROX	dic-17

DATA DE REVISIÓ	abr-20	TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--------	----------------------	-----------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig	OK	Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació	NO	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargoleria	OK	Absorbidor	NO	Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	2
---	---

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

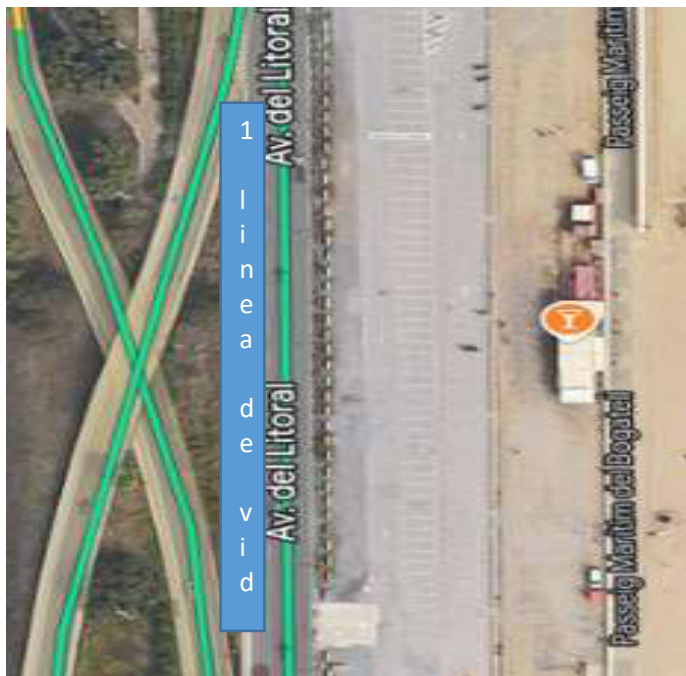

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Ronda Litoral E.24 (Lado Mar) Fecha de ensayo/Testing data: 23/10/2024
--	---



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1



NORCONTROL, S.L.U.

Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n

08193 Bellaterra (BCN)

Tf. 935672000 Ext.52620

FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE

I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS

Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona

Teléfono/Telephone: 900 226 226

Lugar del ensayo/Job site:

PARC CENTRAL POBLENOU (Pou del Mon)

Fecha de ensayo/Testing data:

23/10/2024

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS BESOS

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 2	LINEA DE VIDA			15 m APROX	

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig	OK	Oxidació	SI	Casquets	OK
Oxidació	SI	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargoleria		Absorbidor	NO	Tensor	NO

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA


Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: PARC CENTRAL POBLENOU (Pou del Mon) Fecha de ensayo/Testing data: 23/10/2024
--	---

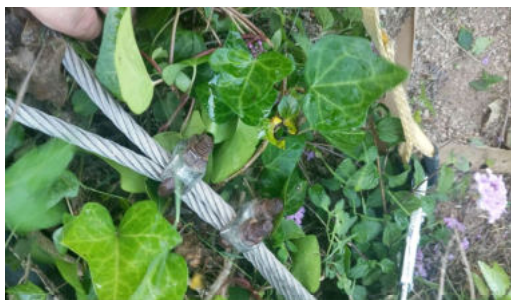


Linea de vida 2



Linea de vida 2



Linea de vida 2



Linea de vida 2



NORCONTROL, S.L.U.

Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n

08193 Bellaterra (BCN)

Tf. 935672000 Ext.52620

FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE

I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS

Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona

Teléfono/Telephone: 900 226 226

Lugar del ensayo/Job site:

PARC CENTRAL POBLENOU (Pou del Mon)

Fecha de ensayo/Testing data:

23/10/2024

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS BESOS

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 3	LINEA DE VIDA			30m APROX	

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	KO	Guardacaps	NO
Ancoratge intermig	OK	Oxidació	SI	Casquets	NO
Oxidació	SI	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargoleria		Absorbidor	NO	Tensor	NO

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge




La línea de vida presenta bastante oxidación en los anclajes y lo que la hace peligrosa para su uso es su falta de tensión.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: PARC CENTRAL POBLENOU (Pou del Mon) Fecha de ensayo/Testing data: 23/10/2024
--	---



Linea de vida 3

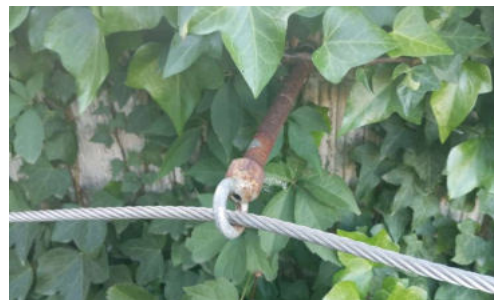

Linea de vida 3



Linea de vida 3



Linea de vida 3



NORCONTROL, S.L.U.

Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n

08193 Bellaterra (BCN)

Tf. 935672000 Ext.52620

FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE

I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS

Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona

Teléfono/Telephone: 900 226 226

Lugar del ensayo/Job site:

PARC CENTRAL NOU BARRIS (Pou del Mon)

Fecha de ensayo/Testing data:

23/10/2024

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS BESOS

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 4	LINEA DE VIDA			25 m APROX	

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	KO	Guardacaps	NO
Ancoratge intermig	OK	Oxidació	SI	Casquets	OK
Oxidació	SI	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargoleria		Absorbidor	NO	Tensor	NO

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



La línea de vida presenta bastante oxidación en los anclajes y lo que la hace peligrosa para su uso es su falta de tensión.


 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: PARC CENTRAL NOU BARRIS (Pou del Mon) Fecha de ensayo/Testing data: 23/10/2024
--	---




Linea de vida 4




Linea de vida 4

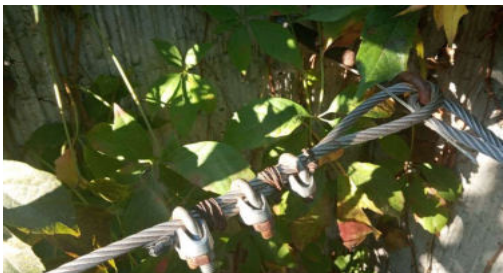

Linea de vida 4

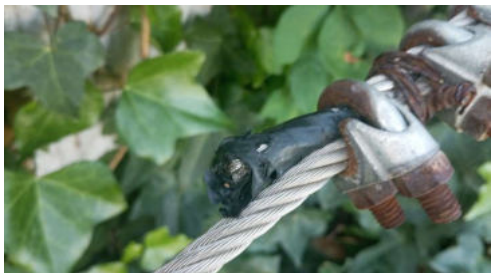

Linea de vida 4



Linea de vida 4

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS BESOS

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 4	LINEA DE VIDA			45 m APROX	

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	KO	Guardacaps	NO
Ancoratge intermig	OK	Oxidació	SI	Casquets	KO
Oxidació	SI	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargolería		Absorbidor	NO	Tensor	NO

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



La línea de vida presenta bastante oxidacion en los anclajes y lo que la hace peligrosa para su uso es su falta de tension.


 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: PARC CENTRAL POBLENOU (Pou del Mon) Fecha de ensayo/Testing data: 23/10/2024
--	---



Linea de vida 5




Linea de vida 5

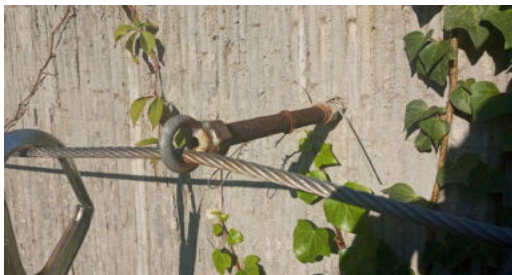

Linea de vida 5



Linea de vida 5

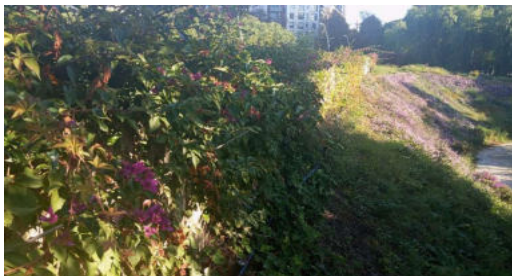

Linea de vida 5

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS BON PASTOR TRINITAT

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1	LINEA DE VIDA		PREVILINE	50 m APROX	

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
------------------------	--	----------------------	-------------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig	OK	Oxidació	NO	Casquets	NO
Oxidació	LIGERA	Deformació	OK	Brides certif	NO
Cargoleria	OK	Absorbidor	NO	Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

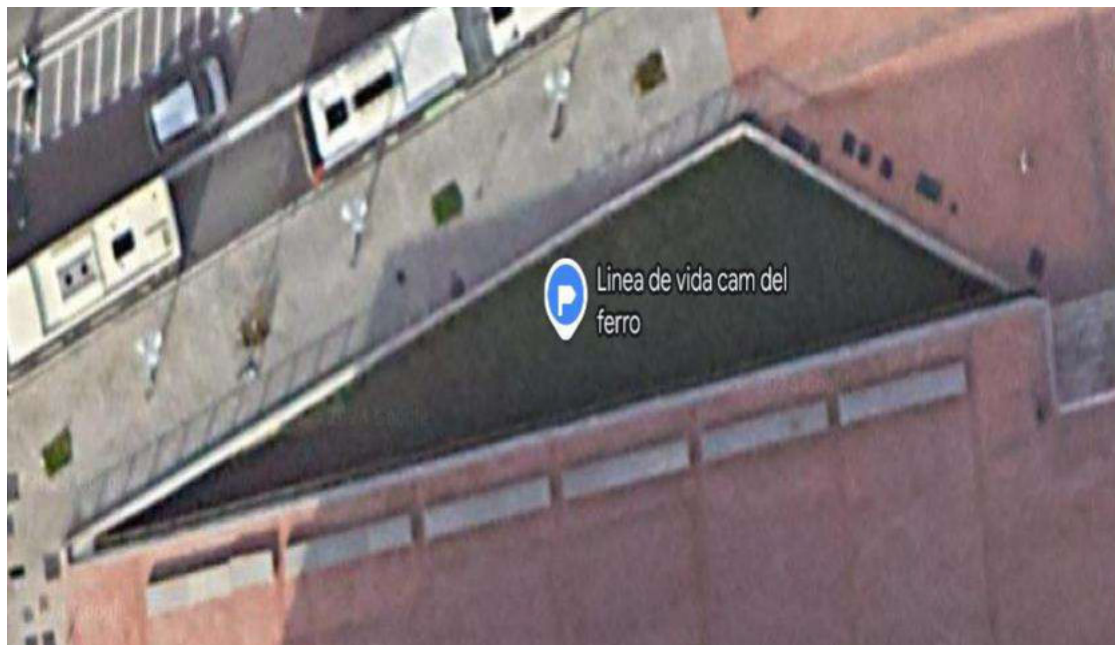

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Bon pastor. Camp del Ferro Fecha de ensayo/Testing data: 22/10/2024
--	---



Linea de vida 1



Linea de vida 1




Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1

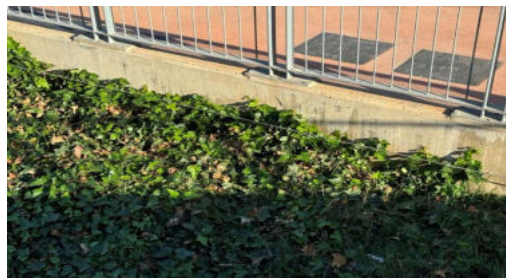

Linea de vida 1

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS BON PASTOR TRINITAT

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 2	LINEA DE VIDA		H-XTENDA (LACHWAY)	180 m APROX	may-08

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
-----------------	---------------	-------------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig	OK	Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació	NO	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargolería	OK	Absorbidor	NO	Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

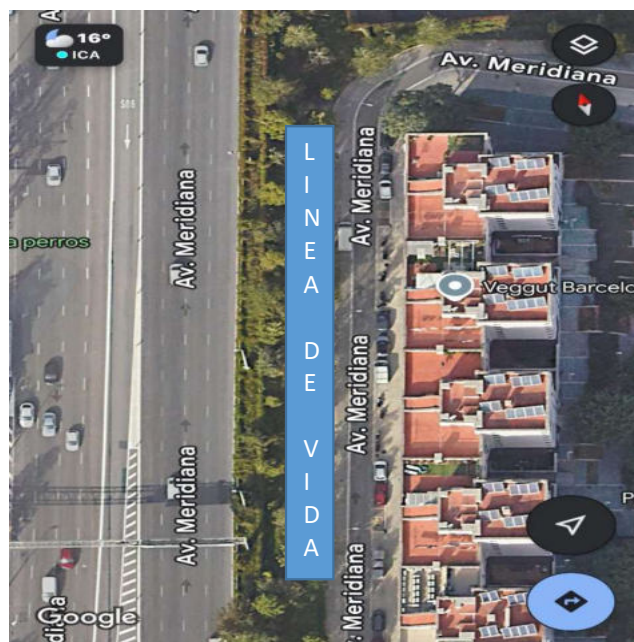


 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Av Meridiana-Pg Santa Coloma Fecha de ensayo/Testing data: 22/10/2024
---	--




Linea de vida 2




Linea de vida 2

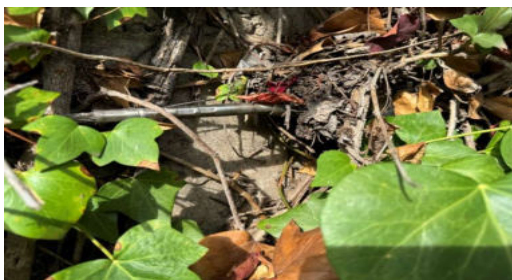

Linea de vida 2

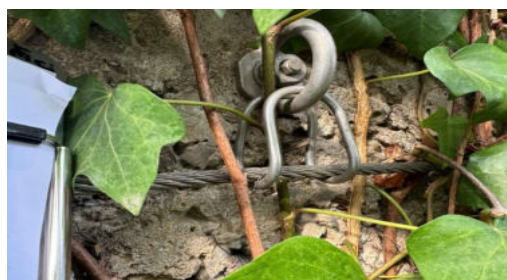

Linea de vida 2

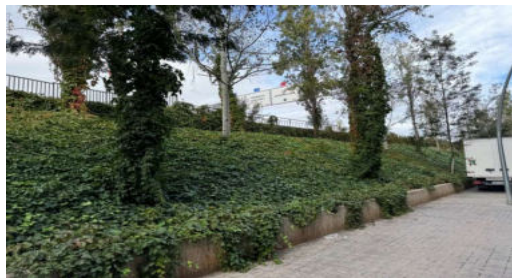

Linea de vida 2



Linea de vida 2

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS BON PASTOR TRINITAT

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº1 a 6	ANCORATGE				

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
-----------------	---------------	-------------------


ANCORATGES			CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem		OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig			Oxidació		Casquets	
Oxidació		NO	Deformació		Brides certif	
Cargolería		OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

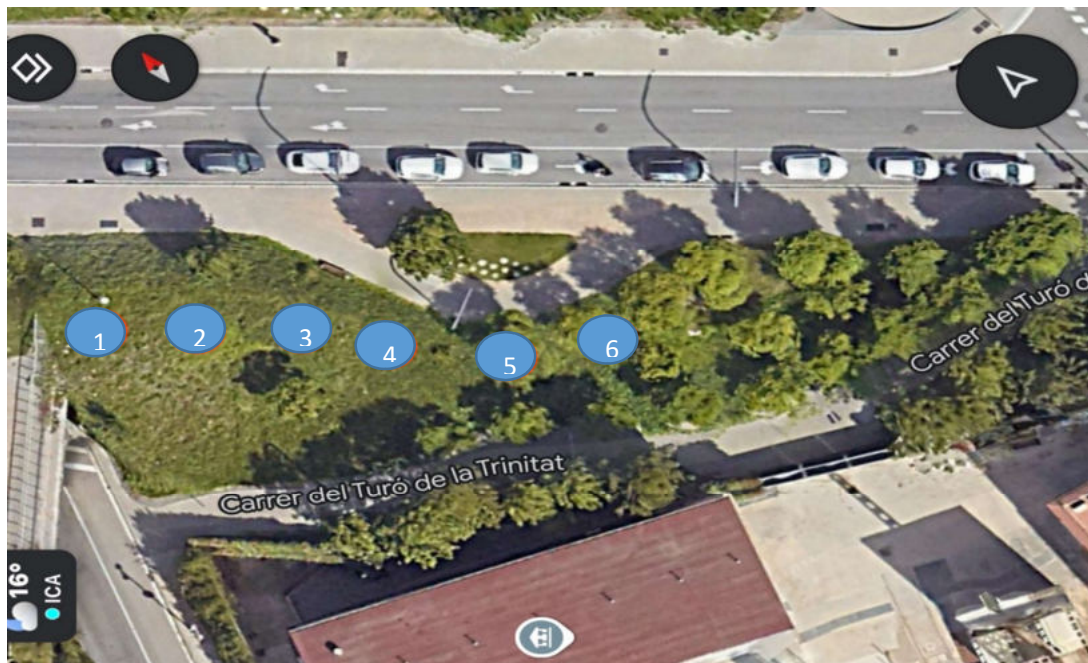

Los 6 anclajes son del mismo tipo, estan en buen estado pero no presentan ningun tipo de informacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Av Meridiana- Crtra Ribes (Lado Llobregat) Fecha de ensayo/Testing data: 22/10/2024
--	---



ANCLAJE 1



ANCLAJE 2



ANCLAJE 3



ANCLAJE 4



ANCLAJE 5



ANCLAJE 6

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS BON PASTOR TRINITAT

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº1 y 2	ANCORATGE				

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
------------------------	--	----------------------	-------------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargolería	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

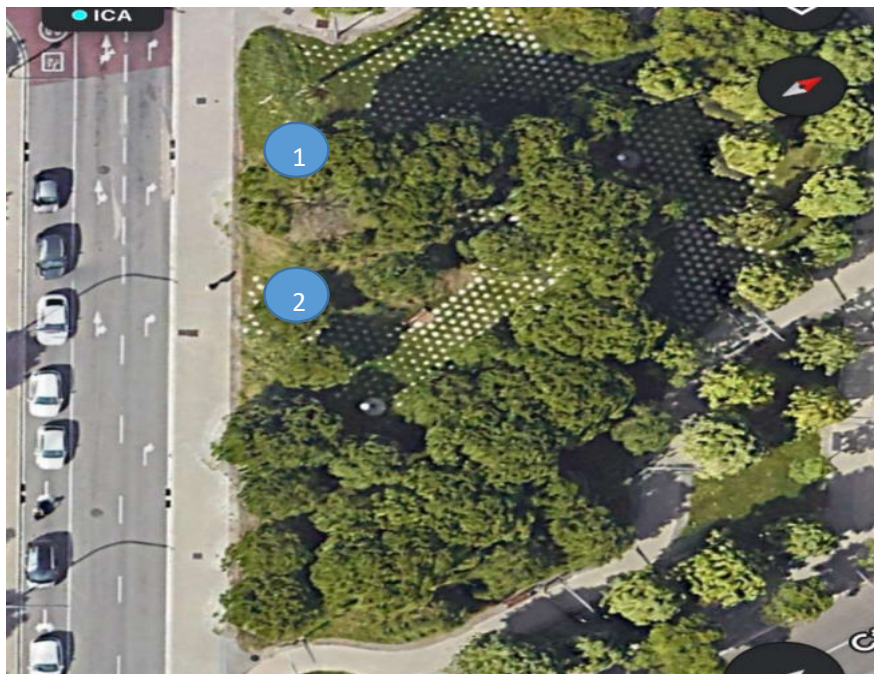

Los 2 anclajes son del mismo tipo, estan en buen estado pero no presentan ningun tipo de informacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Av Meridiana- Crtra Ribes (Lado Besòs) Fecha de ensayo/Testing data: 22/10/2024
--	--



ANCLAJE 1



ANCLAJE 2



ZONA INSPECCIONADA

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS BON PASTOR TRINITAT

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Del 1 al 18	ANCORATGE		FADERS		

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
-----------------	---------------	-------------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

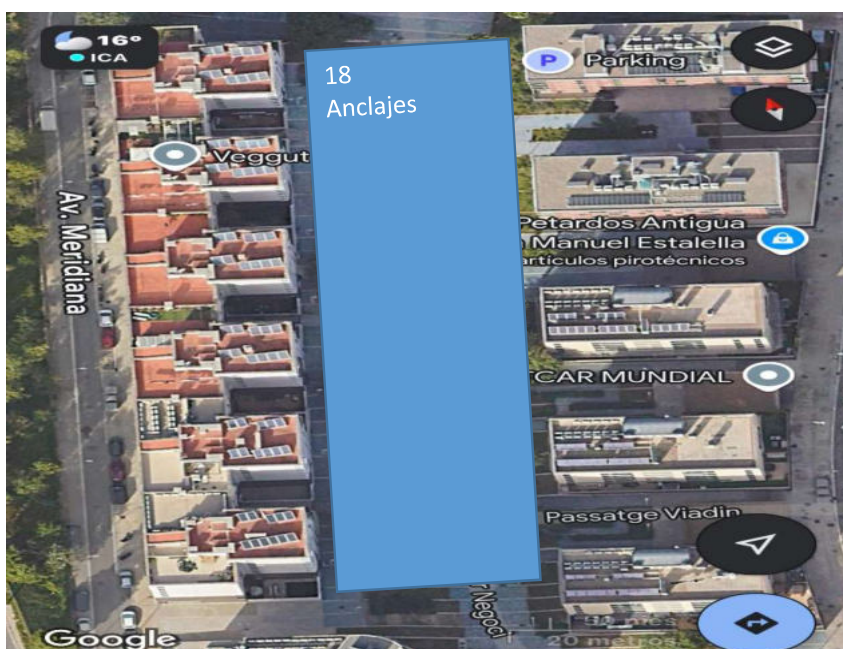


Se han localizado en todos los parterres de la plaza un total de 18 anclajes. Los 18 anclajes son del mismo tipo, estan en buen estado pero no presentan ningun tipo de informacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Plaça de la Primavera Fecha de ensayo/Testing data: 22/10/2024
--	---



Anclaje tipo inspeccionado

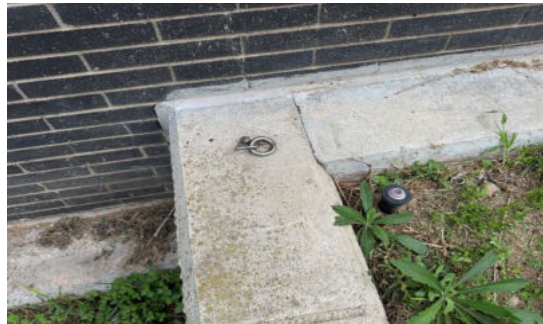

Anclaje tipo inspeccionado



Anclaje tipo inspeccionado




Anclaje tipo inspeccionado



Anclaje tipo inspeccionado



Anclaje tipo inspeccionado

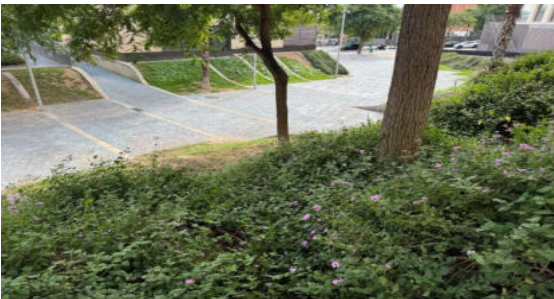

Anclaje tipo inspeccionado



Anclaje tipo inspeccionado



NORCONTROL, S.L.U.

Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n

08193 Bellaterra (BCN)

Tf. 935672000 Ext.52620

FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE

I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS

Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona

Teléfono/Telephone: 900 226 226

Lugar del ensayo/Job site:

Via Favència (Costat CMC)

Fecha de ensayo/Testing data:

30/10/2024

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS CANYELLES PROSPERTITAT

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1 a 8	Ancoratge		FADERS		

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
-----------------	---------------	-------------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	SI	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

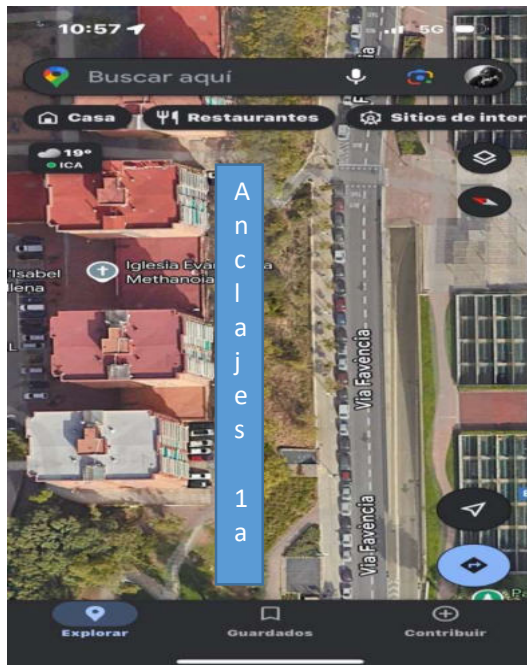


Los ocho anclajes son del mismo modelo. No presentan ningun tipo de informacion ni certificacion. Tambien se detectan tres puntos sustraídos.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Via Favencia (Costat CMC) Fecha de ensayo/Testing data: 30/10/2024
--	---



Anclaje tipo localizado

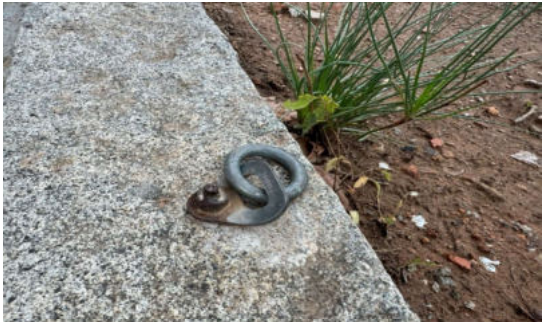


Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo sustraído

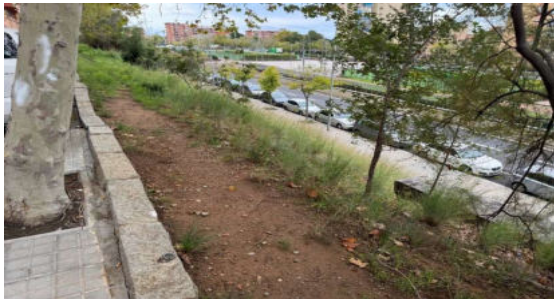

Zona tipo Inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS CANYELLES PROSPERTITAT

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1	Linea de vida		FALLPROTECT	36m APROX	

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
-----------------	---------------	-------------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig		Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació	NO	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



En general esta en buen estado, hay una zona a la que no se tiene acceso y no se puede comprobar.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: c/ Miguel Hernandez con Federico Garcia Lorca Fecha de ensayo/Testing data: 30/10/2024
--	--



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLET 2 DERECHA PUERTA CASTILLO)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 4, 5 y 6	Ancoratge		PAF180 12		03/22 Y 05/22

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	OK	Deformació		Brides certif	
Cargolería	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	1
---	---

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

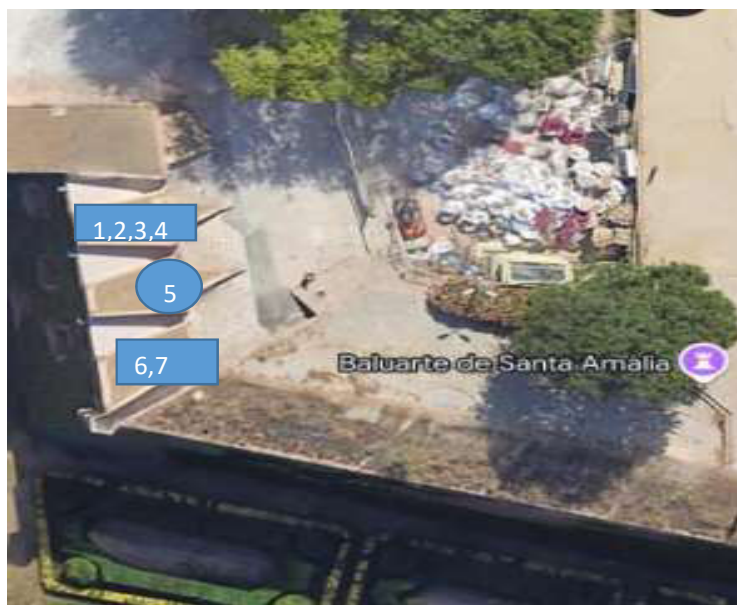

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLET 2) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	--



Anclaje Numero 4



Anclaje Numero 4



Anclaje Numero 5



Anclaje Numero 5



Anclaje Numero 6



Anclaje Numero 6

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLET 2 DERECHA PUERTA CASTILLO)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 7	Ancoratge	TS164115:2013	G.M.D		feb-22

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	1
---	---

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

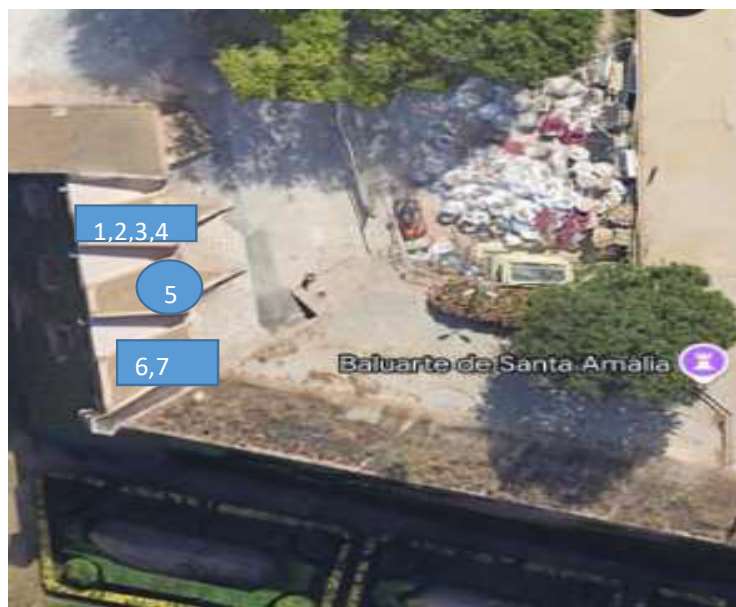

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLET 2) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Anclaje numero 7



Anclaje numero 7

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLET 2 IZQUIERDA PUERTA CASTILLO)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1,3 y 4	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargolería	NO	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	
---	--

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

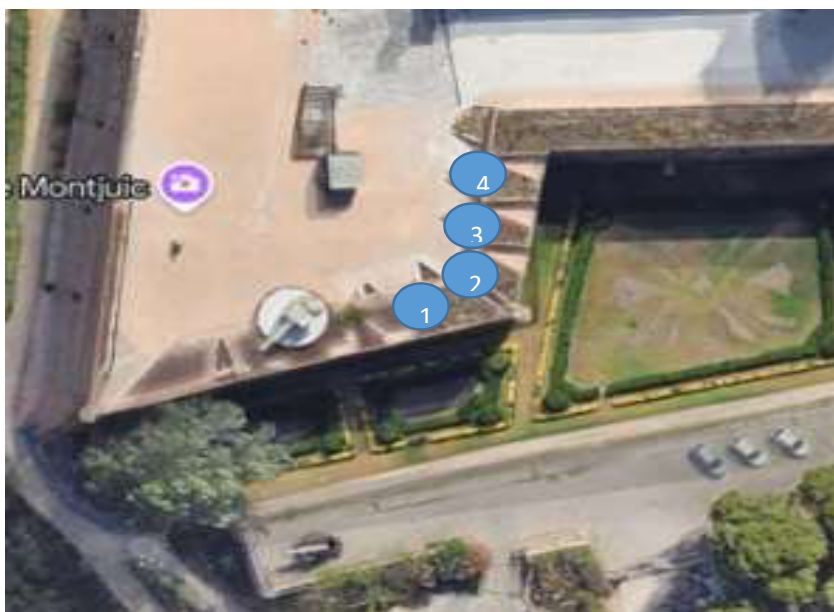

Los anclaje no se ve si estan anclados a una zona cementada o solo en la arena, sin ninguna referencia.

Applus⁺ NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuïc (MERLET 2) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Anclaje numero 1



Anclaje numero 1



Anclaje numero 3



Anclaje numero 3



Anclaje numero 4



Anclaje numero 4

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLET 2 IZQUIERDA PUERTA CASTILLO)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 2	Ancoratge		FADERS		

DATA DE REVISIÓ

TÈCNIC APPLUS

M.ANGEL CARDOSO

ANCORATGES

CABLES I TERMINALS


Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	SI	Deformació		Brides certif	
Cargolería	KO	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

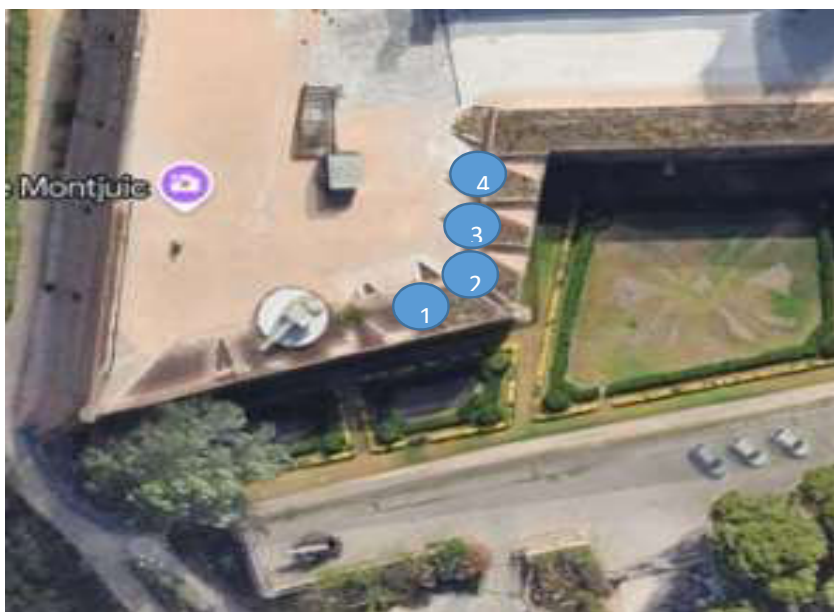

Se detectan dos puntos de anclaje en esta zona , deteriorados y que parecían formar parte antiguamente de una línea de vida que ya no existe.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLET 2) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Anclaje numero 2



Anclaje numero 2

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLET 3 FRONTAL HASTA BALUARTE DE SANTA AMALIA)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem		Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació		Deformació		Brides certif	
Cargoleria		Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	
---	--

Conclusió


- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☒ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



NO se localiza ningun punto de anclaje en esta zona.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLET 3) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---

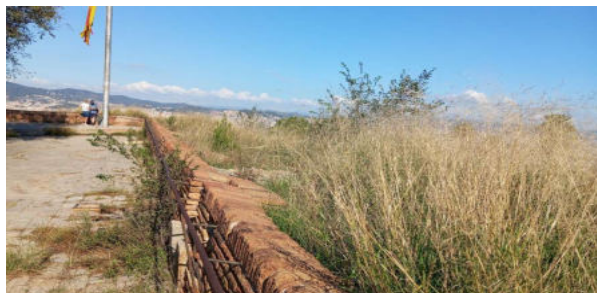

Merlet 3 (zona sin anclajes)

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLETS 4 FOSSAT SANTA EULALIA)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1,2,3,4 y 5	Ancoratge		FADERS		

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	KO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	KO	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	1
---	---

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Los 5 anclajes son de la misma marca y estan en el mismo estado, parecen formar parte de una antigua linea de vida.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLETS 4) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Anclajes numero 1 y 2



Anclajes numero 1 y 2



Anclajes numero 3 y 4



Anclajes numero 3 y 4



Anclaje numero 5

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLETS 5 BALUARD DE SANTA AMALIA)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS	
Ancoratge extrem		Tensió	Guardacaps
Ancoratge intermig		Oxidació	Casquets
Oxidació		Deformació	Brides certif
Cargoleria		Absorbidor	Tensor

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
☒ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



No se encuentra ningún punto de anclaje, puesto que la vegetación impide su localización, se recomienda desbrozar. Se busco apartando vegetación, pero no se localizo ningún punto.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLETS 5) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Zona Baluard Santa Amalia



Zona Baluard Santa Amalia



Zona Baluard Santa Amalia

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLETS 6 TIR AMB ARC)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1,2,3,4,5,6,7,8,9			FADERS		

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------

ANCORATGES			CABLES I TERMINALS		
Ancoratge extrem	OK		Tensió		Guardacaps
Ancoratge intermig			Oxidació		Casquets
Oxidació	KO		Deformació		Brides certif
Cargoleria	KO		Absorbidor		Tensor

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió



El sistema inspeccionat és correcte.



El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.



El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.



No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Los anclajes 1,2,3,4,6,7,8 y 9 son del mismo tipo sin ninguna referencia y en el mismo estado de oxidacion. El anclaje numero 5 ha sido retirado.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLETS 6) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Anclaje 1 y 2



Anclaje 1 y 2



Anclaje 3 y 4




Anclaje 3 y 4



Anclaje 5 y 6



Anclaje 5 y 6

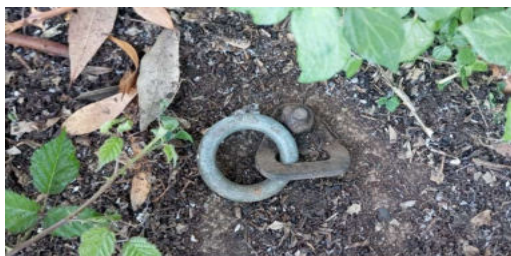

Anclaje 7



Anclaje 7



Anclaje 8 y 9



Anclaje 8 y 9

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLET 7 DARRERA OFICINES)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ

DATA DE REVISIÓ

TÈCNIC APPLUS

M.ANGEL CARDOSO

ANCORATGES

CABLES I TERMINALS

Ancoratge extrem		Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació		Deformació		Brides certif	
Cargoleria		Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☒ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



No se localiza ningún punto de anclaje en esta zona.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLET 7) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
---	---



Merlet 7 (zona sin anclajes)



NORCONTROL, S.L.U.

Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n

08193 Bellaterra (BCN)

Tf. 935672000 Ext.52620

FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE

I/O LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS

Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona

Teléfono/Telephone: 900 226 226

Lugar del ensayo/Job site:

Castell de Montjuic (MERLET 8)

Fecha de ensayo/Testing data:

21/10/2024

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLET 8 JARDINS DARRERA OFICINES)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem		Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació		Deformació		Brides certif	
Cargolería		Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	
------------------------------------	--

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



No se localiza ningun punto de anclaje en esta zona.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLET 8) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	--



Merlet 8 (zona sin anclajes)



Merlet 8 (zona sin anclajes)

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLET 1 FACHADA PRINCIPAL DERECHA PUERTA CASTILLO)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 6 y 7	Ancoratge	?	FADERS		?

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargolería	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Se encuentran dos puntos de anclaje que estan en buen estado pero no presentan ningun tipo de dato. (Parecen ser puntos de paso de una linea de vida anterior)

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLET 1) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Anclajes numero 6 y 7



Anclajes numero 6 y 7

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLET 1 FACHADA PRINCIPAL DERECHA PUERTA CASTILLO)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 8	Linea de vida	ID 1357342	GM	28 M APROX	?

DATA DE REVISIÓ	?	TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	---	---------------	-----------------

ANCORATGES			CABLES I TERMINALS		
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig	OK	Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació	NO	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargoleria	OK	Absorbidor	OK	Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	4
------------------------------------	---

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



En general se encuentra en buen estado, faltaria revisarla anualmente.

NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLET 1) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Linea de vida numero 8



Linea de vida numero 8



Linea de vida numero 8



Linea de vida numero 8



Linea de vida numero 8

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLET 1 FACHADA PRINCIPAL DERECHA PUERTA CASTILLO)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 9 y 10	Ancoratge	?	FADERS		?

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	SI	Deformació		Brides certif	
Cargolería	KO	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Se encuentran dos puntos de anclaje que estan en mal estado y no presentan ningun tipo de dato. (Parecen ser puntos de paso de una linea de vida anterior)

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLET 1) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Anclajes numero 9 y 10



Anclajes numero 9 y 10

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLET 1 FACHADA PRINCIPAL IZQUIERDA PUERTA CASTILLO)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1	Linea de vida	?	PROLINE	36 M APROX	?

DATA DE REVISIÓ

TÈCNIC APPLUS

M.ANGEL CARDOSO

ANCORATGES

CABLES I TERMINALS

Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig	OK	Oxidació	KO	Casquets	NO
Oxidació	SI	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargoleria	OK	Absorbidor	NO	Tensor	NO

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Se detectan dos puntos de anclaje en esta zona , deteriorados y que parecian formar parte antiguamente de una linea de vida que ya no existe.


 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLET 1) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	--



Línea de vida número 1



Línea de vida número 1 (SIN CASQUILLOS)

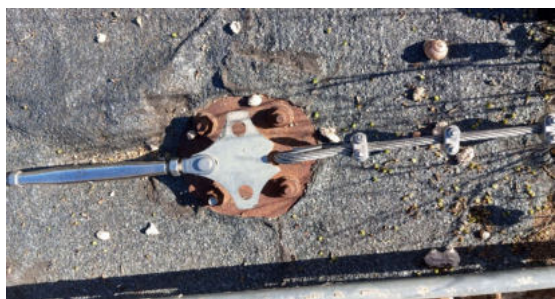

Línea de vida número 1 (OXIDO)



Línea de vida número 1 (OXIDO)



Línea de vida número 1 (FALTA DESBROZAR)

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLET 1 FACHADA PRINCIPAL IZQUIERDA PUERTA CASTILLO)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 2 Y 5	Ancoratge	PAF180 12	PROTEKT		02/22 Y 03/22

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargolería	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	1
---	---

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLET 1) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Anclaje numero 2



Anclaje numero 2



Anclaje numero 5



Anclaje numero 5

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLET 1) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Anclaje numero 3



Anclaje numero 3

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLET 1 FACHADA PRINCIPAL PUERTA CASTILLO)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 4	Ancoratge		FIXE		

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargolería	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



El anclaje esta en buen estado pero no presenta ningun tipo de dato.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS
	Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA
	Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona
	Teléfono/Telephone: 900 226 226
	Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLET 1)
	Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024



Anclaje numero 4



Anclaje numero 4

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLET 2 DERECHA PUERTA CASTILLO)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1	Ancoratge	TS16415:2013	G.M.D		feb-22

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	4
---	---

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

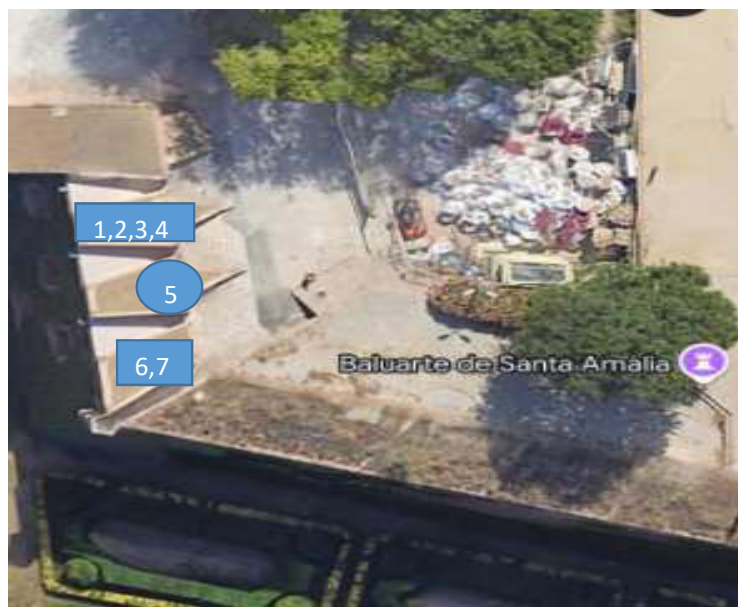

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLET 2) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Anclaje numero 1



Anclaje numero 1

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

CASTELL MONTJUIC (MERLET 2 DERECHA PUERTA CASTILLO)

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 2 Y 3	Ancoratge		FADERS		

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	---------------	-----------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	SI	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	KO	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	1
------------------------------------	---

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

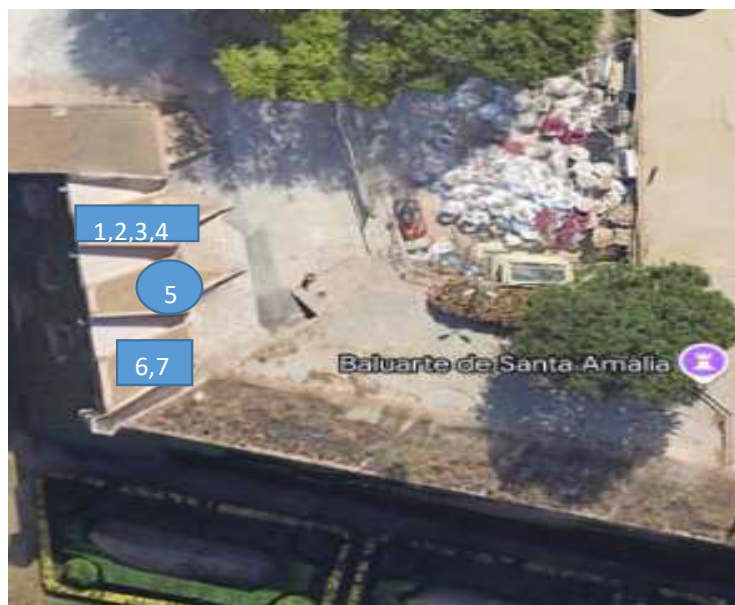

Se encuentran dos puntos de anclaje bastante oxidados, justo al lado de uno instalado mas reciente.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Castell de Montjuic (MERLET 2) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Anclajes numero 2 y 3



Anclajes numero 2 y 3

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

CIUTAT MERIDIANA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
1,2,3,4,5	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------

ANCORATGES			CABLES I TERMINALS		
Ancoratge extrem			Tensió		Guardacaps
Ancoratge intermig			Oxidació		Casquets
Oxidació		SI	Deformació		Brides certif
Cargoleria		NO	Absorbidor		Tensor

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió


- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge




Los puntos de anclaje son anillas soldadas a la barandilla. NO tienen ningun tipo de dato ni pruebas realizadas.


 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: C/Agudes -C/Costabona (escales) Fecha de ensayo/Testing data: 22/10/2024
--	--

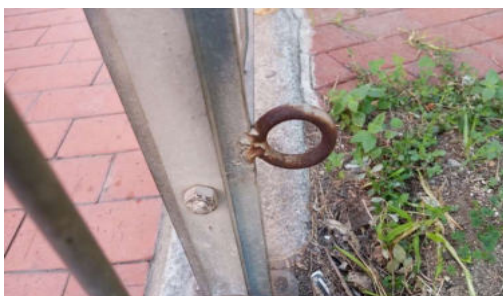


Anclaje numero 1

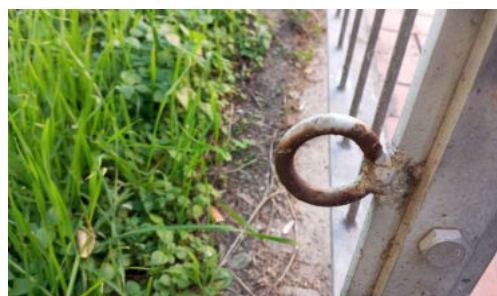

Anclaje numero 2

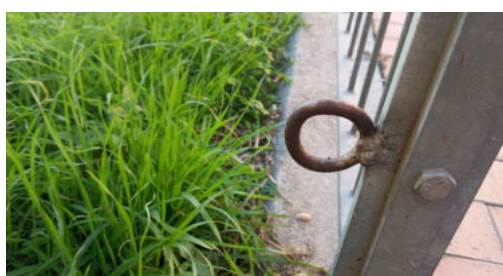

Anclaje numero 3

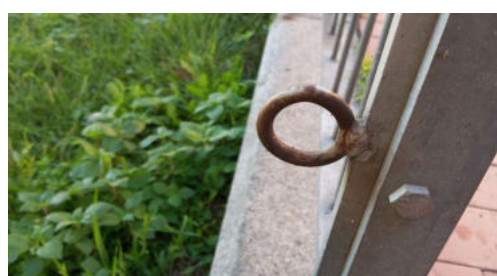

Anclaje numero 4



Anclaje numero 5

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

CIUTAT MERIDIANA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
6,7,8,9,10,11	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem		Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	SI	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	NO	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Los puntos de anclaje son anillas soldadas a la barandilla. NO tienen ningun tipo de dato ni pruebas realizadas.


 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: C/Agudes -C/Costabona (escales) Fecha de ensayo/Testing data: 22/10/2024
--	--




Anclaje numero 6




Anclaje numero 7

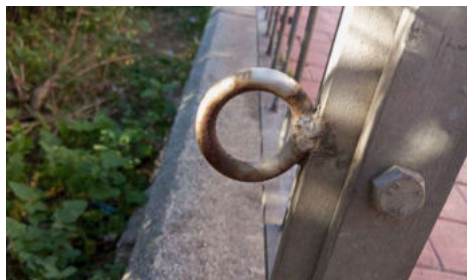


Anclaje numero 8

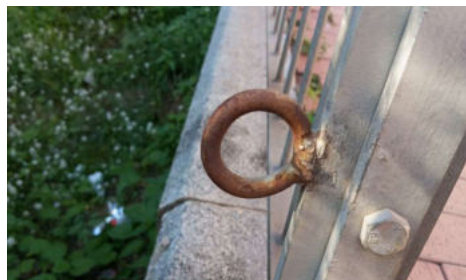

Anclaje numero 9

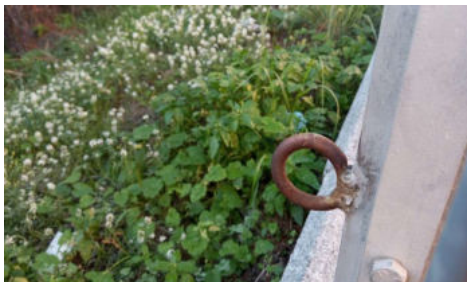

Anclaje numero 10

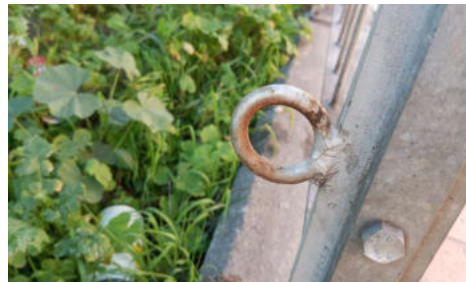

Anclaje numero 11



NORCONTROL, S.L.U.

Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n

08193 Bellaterra (BCN)

Tf. 935672000 Ext.52620

FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE

I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS

Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona

Teléfono/Telephone: 900 226 226

Lugar del ensayo/Job site:

Balconeras Biblioteca

Fecha de ensayo/Testing data:

22/10/2024

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

CIUTAT MERIDIANA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1	LINEA DE VIDA	1002/22	PREVILINE	46 m APROX	may-22

DATA DE REVISIÓ	oct-23	TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--------	---------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig		Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació	NO	Deformació	NO	Brides certif	OK
Cargoleria	OK	Absorbidor	OK	Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	2
------------------------------------	---

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Balconeras Biblioteca Fecha de ensayo/Testing data: 22/10/2024
--	---



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1



NORCONTROL, S.L.U.

Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n

08193 Bellaterra (BCN)

Tf. 935672000 Ext.52620

FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE

I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS

Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona

Teléfono/Telephone: 900 226 226

Lugar del ensayo/Job site:

Balconeras Biblioteca

Fecha de ensayo/Testing data:

22/10/2024

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

CIUTAT MERIDIANA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 2	LINEA DE VIDA	1002/22	PREVILINE	18 m APROX	may-22

DATA DE REVISIÓ	oct-23	TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--------	---------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig		Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació	NO	Deformació	NO	Brides certif	OK
Cargoleria	OK	Absorbidor	OK	Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	2
------------------------------------	---

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Applus⁺ NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Balconeras Biblioteca Fecha de ensayo/Testing data: 22/10/2024
---	---



Linea de vida 2




Linea de vida 2



Linea de vida 2



Linea de vida 2

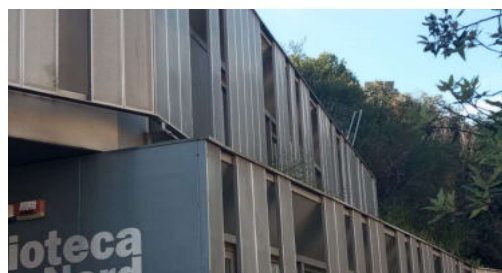

Linea de vida 2



NORCONTROL, S.L.U.

Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n

08193 Bellaterra (BCN)

Tf. 935672000 Ext.52620

FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE

I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS

Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona

Teléfono/Telephone: 900 226 226

Lugar del ensayo/Job site:

Terraza Biblioteca

Fecha de ensayo/Testing data:

22/10/2024

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

CIUTAT MERIDIANA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 2	LINEA DE VIDA	1002/22	PREVILINE	42 m APROX	may-22

DATA DE REVISIÓ	oct-23	TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--------	---------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig		Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació	NO	Deformació	NO	Brides certif	OK
Cargoleria	OK	Absorbidor	OK	Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	2
------------------------------------	---

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



En uno de los pasadores de cable falta un tornillo, por lo demas todo correcto.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Terraza Biblioteca Fecha de ensayo/Testing data: 22/10/2024
--	--



Linea de vida 3



Linea de vida 3



Linea de vida 3



Linea de vida 3



Linea de vida 3



Linea de vida 3



Linea de vida 3

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

CIUTAT MERIDIANA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
1,2,3,4,5,6,7,8,9	ANCORATGE		WURTH		

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------

ANCORATGES			CABLES I TERMINALS		
Ancoratge extrem		OK	Tensió		Guardacaps
Ancoratge intermig			Oxidació		Casquets
Oxidació		NO	Deformació		Brides certif
Cargoleria		OK	Absorbidor		Tensor

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió



El sistema inspeccionat és correcte.



El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.




El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.




No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

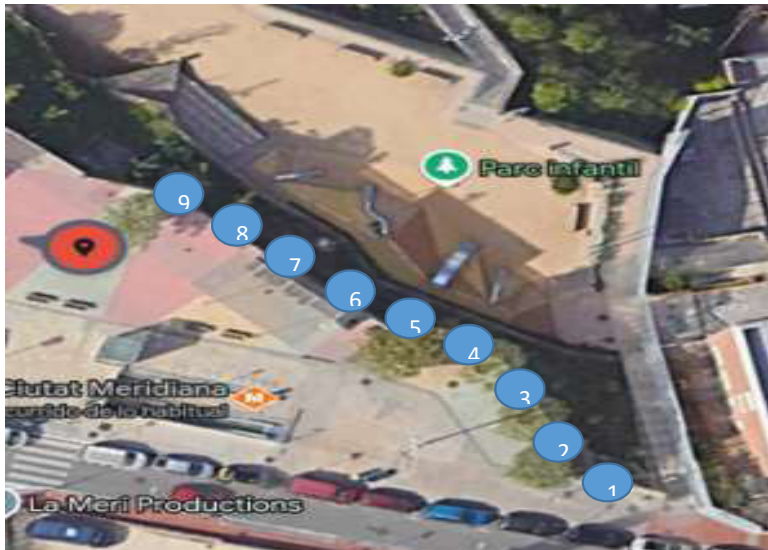

Los 9 puntos de anclaje estan en buen estado pero no presentan ningun tipo de informacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Parterres Rasos de Peguera (1) Fecha de ensayo/Testing data: 22/10/2024
--	---

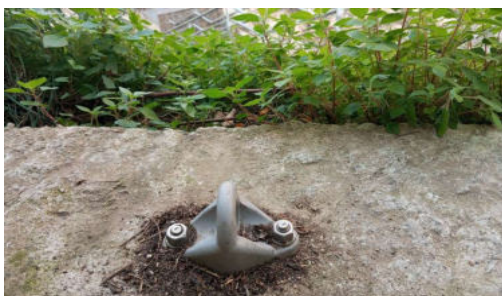

Anclaje 1




Anclaje 2



Anclaje 3



Anclaje 4

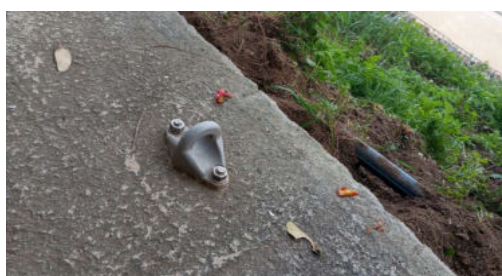

Anclaje 5



Anclaje 6



Anclaje 7



Anclaje 8



Anclaje 9

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

CIUTAT MERIDIANA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	ANCORATGE		WURTH		

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------

ANCORATGES			CABLES I TERMINALS		
Ancoratge extrem		OK	Tensió		Guardacaps
Ancoratge intermig			Oxidació		Casquets
Oxidació		NO	Deformació		Brides certif
Cargoleria		OK	Absorbidor		Tensor

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

☐

El sistema inspeccionat és correcte.

☒

El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.

☐

El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.

☐

No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Los 11 puntos de anclaje estan en buen estado pero no presentan ningun tipo de informacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Parterres Rasos de Peguera (2) Fecha de ensayo/Testing data: 22/10/2024
--	--



Anclaje 1



Anclaje 2



Anclaje 3



Anclaje 4



Anclaje 5



Anclaje 6



Anclaje 7



Anclaje 8



Anclaje 9



Anclaje 10



Anclaje 11

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

CIUTAT MERIDIANA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
1 al 25	ANCORATGE				

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	NO	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Hay un total de 35 anillas soldadas al perímetro de la barandilla que hacen las funciones de punto de anclaje. Todas estan en buen estado y galvanizadas.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Parterres Rasos de Peguera (3) Fecha de ensayo/Testing data: 22/10/2024
--	--



Anclaje tipo inspeccionado



Anclaje tipo inspeccionado



Zona de las barandillas con anclajes



Zona de las barandillas con anclajes

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

CIUTAT MERIDIANA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
1 al 14	ANCORATGE				

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	---------------	-----------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	NO	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

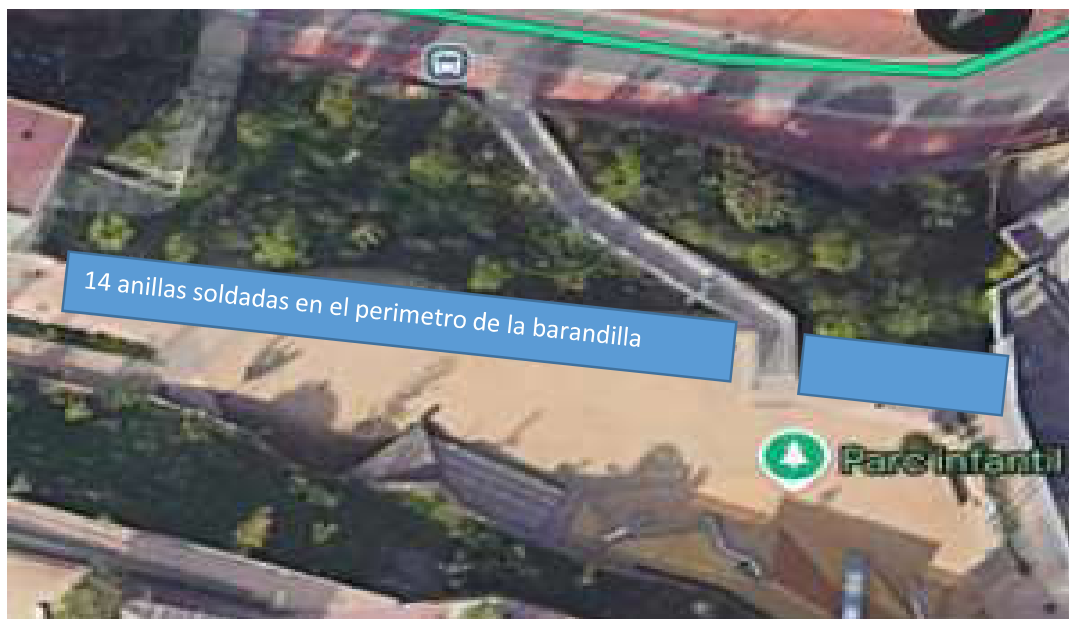

Hay un total de 14 anillas soldadas al perímetro de la barandilla que hacen las funciones de punto de anclaje. Todas estan en buen estado y galvanizadas.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Parterres Rasos de Peguera (4) Fecha de ensayo/Testing data: 22/10/2024




Anclaje tipo inspeccionado



Anclaje tipo inspeccionado



Zona de las barandillas con anclajes

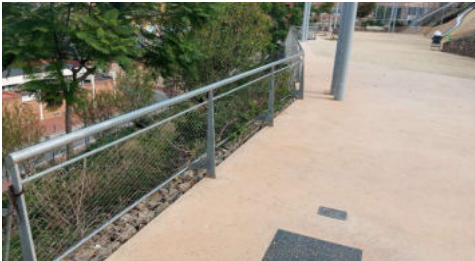

Zona de las barandillas con anclajes

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS CREUETA DEL COLL

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
1,2,3,4,5,6,7,8,9	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
------------------------	--	----------------------	-------------------

ANCORATGES			CABLES I TERMINALS		
Ancoratge extrem		OK	Tensió		Guardacaps
Ancoratge intermig			Oxidació		Casquets
Oxidació		LIGERA	Deformació		Brides certif
Cargoleria		NO	Absorbidor		Tensor

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

☐

El sistema inspeccionat és correcte.

☐

El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.

☐

El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.

☐

No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Los nueve anclajes son anillas ancladas en cemento, estan en buen estado y no se aprecia ninguna informacion sobre ellos.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Mare de deu dels Angels (TEIXONERA) Fecha de ensayo/Testing data: 29/10/2024
--	--



Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo localizado



Zona Inspeccionada



Zona Inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS CREUETA DEL COLL

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 10 a 30	Ancoratge	LDV029	FALLPROTECT		jul-23

DATA DE REVISIÓ	sep-24	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
------------------------	--------	----------------------	-------------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig	OK	Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió



El sistema inspeccionat és correcte.



El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.




El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.



No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

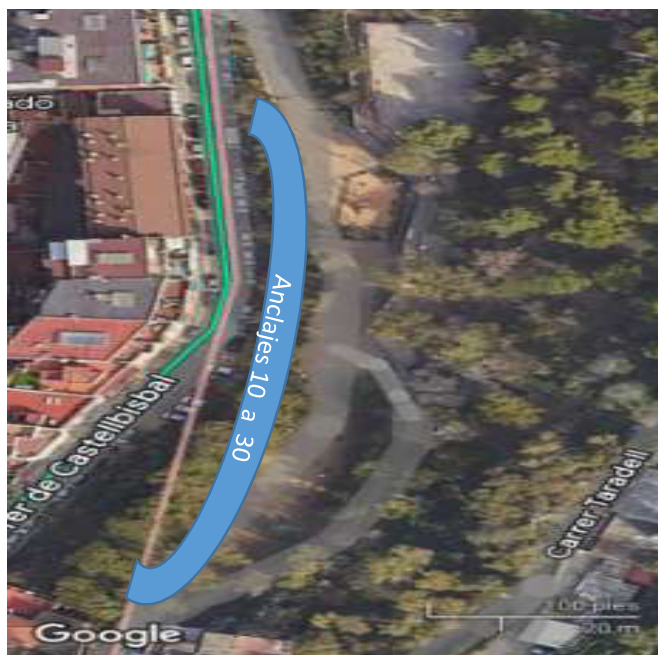

Los 21 anclajes estan localizados a lo largo del perimetro del talud, estan en perfecto estado y con las revisiones al dia.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Mare de deu dels Angels (TEIXONERA) Fecha de ensayo/Testing data: 29/10/2024
--	---



Anclaje tipo localizado (FICHA)



Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo localizado



Zona inspeccionada



Zona inspeccionada



NORCONTROL, S.L.U.

Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n
08193 Bellaterra (BCN)
Tf. 935672000 Ext.52620

FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS

Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona

Teléfono/Telephone: 900 226 226

Lugar del ensayo/Job site:

C/ Jocs del 92 (Baseball)

Fecha de ensayo/Testing data:

25/10/2024

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS EIXAMPLE SANTS MONTJUIC - ANELLA OLIMPICA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
1,2,3,4,5,6,7	Ancoratge		FADERS		

DATA DE REVISIÓ

TÈCNIC APPLUS

M.ANGEL CARDOSO

ANCORATGES

Ancoratge extrem	KO	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	SI	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió



El sistema inspeccionat és correcte.



El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.



El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.



No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Los 7 anclajes localizados estan muy oxidados y no se tienen ninguna informacion de ellos.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: C/ Jocs del 92 (Baseball) Fecha de ensayo/Testing data: 25/10/2024
--	--



Anclaje Numero 1



Anclaje Numero 2




Anclaje Numero 3



Anclaje Numero 4



Anclaje Numero 5

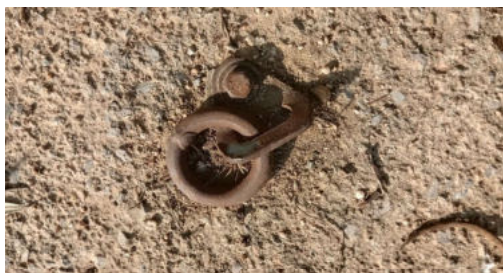

Anclaje Numero 6



Anclaje Numero 7



Zona Inspeccionada



NORCONTROL, S.L.U.
Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n
08193 Bellaterra (BCN)
Tf. 935672000 Ext.52620

**FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE
I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS**

Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona

Teléfono/Telephone: 900 226 226

Lugar del ensayo/Job site:

FCC Alts Forns (La vinya) CAMPO DAMM

Fecha de ensayo/Testing data:

25/10/2024

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS EIXAMPLE SANTS MONTJUIC - ANELLA OLÍMPICA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
1,2,3,4,5	Ancoratge		PEX AFX		

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Los 5 anclajes son del mismo modelo y no se tiene ninguna informacion. El numero 4 esta ligeramente doblado y del numero 5 sale una linea de vida que no se ve hasta donde llega al estar enterrada entre la tierra y la maleza. No se tiene ninguna informacion de la linea de vida.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: FCC Alts Forns (La vinya) CAMPO DAMM Fecha de ensayo/Testing data: 25/10/2024
--	--



Anclaje Numero 1



Anclaje Numero 2



Anclaje Numero 3



Anclaje Numero 4



Anclaje Numero 5 (Salida de linea de vida)



Linea de vida enterrada



Zona inspeccionada (ANCLAJES)



Zona linea de vida enterrada



NORCONTROL, S.L.U.

Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n

08193 Bellaterra (BCN)

Tf. 935672000 Ext.52620

FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS

Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona

Teléfono/Telephone: 900 226 226

Lugar del ensayo/Job site:

FCC Plaça Teresa Claramunt

Fecha de ensayo/Testing data:

25/10/2024

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS EIXAMPLE SANTS MONTJUIC - ANELLA OLIMPICA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
1,2,3,4	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Los anclajes son del mismo tipo y estan en buen estado, pero no tienen ningun tipo de informacion. Tambien se detecta un punto vandalizado donde se ha sustraído el punto de anclaje.

Applus⁺ NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: FCC Plaça Teresa Claramunt Fecha de ensayo/Testing data: 25/10/2024
---	---



Anclaje Numero 1



Anclaje Numero 1



Anclaje Numero 2



Anclaje Numero 2



Anclaje Numero 3



Anclaje Numero 3



Anclaje Numero 4



Anclaje Numero 4



NORCONTROL, S.L.U.

Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n

08193 Bellaterra (BCN)

Tf. 935672000 Ext.52620

FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE

I/O LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS

Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona

Teléfono/Telephone: 900 226 226

Lugar del ensayo/Job site:

FCC Plaça Teresa Claramunt

Fecha de ensayo/Testing data:

25/10/2024

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS EIXAMPLE SANTS MONTJUIC - ANELLA OLÍMPICA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
5,6,7,8	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

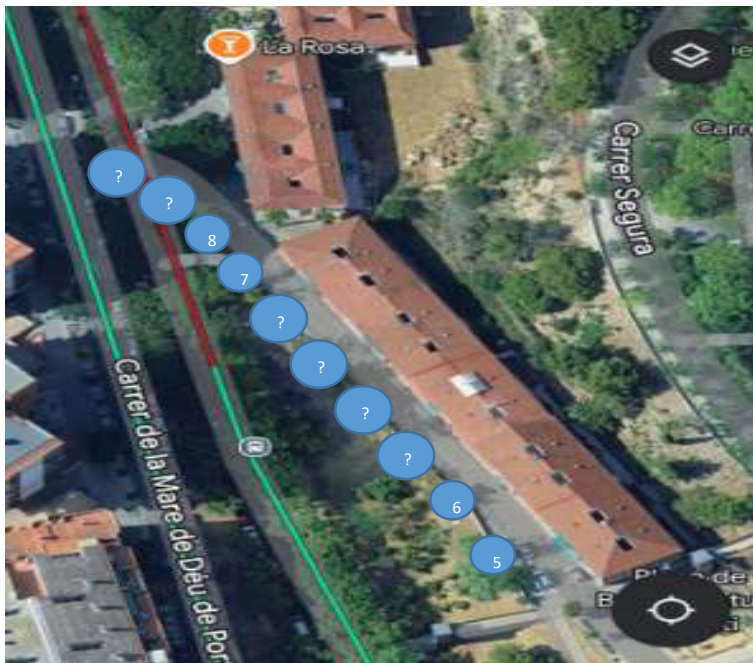

Los 4 anclajes son del mismo tipo y estan en buen estado, pero no tienen ningun tipo de informacion. Tambien se detectan 6 puntos vandalizados donde se ha sustraído el punto de anclaje.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: FCC Plaça Teresa Claramunt Fecha de ensayo/Testing data: 25/10/2024
--	--



Anclaje Numero 5



Anclaje Numero 6



Anclaje Numero 7



Anclaje Numero 8



Ejemplo de anclaje sustraído



Zona inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS EIXAMPLE SANTS MONTJUIC - ESTACIO DEL NORD

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1 y 2	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
-----------------	---------------	-------------------


ANCORATGES	CABLES I TERMINALS
Ancoratge extrem	Tensió
Ancoratge intermig	Oxidació
Oxidació	Deformació
Cargoleria	Absorbidor
	Guardacaps
	Casquets
	Brides certif
	Tensor

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☒ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

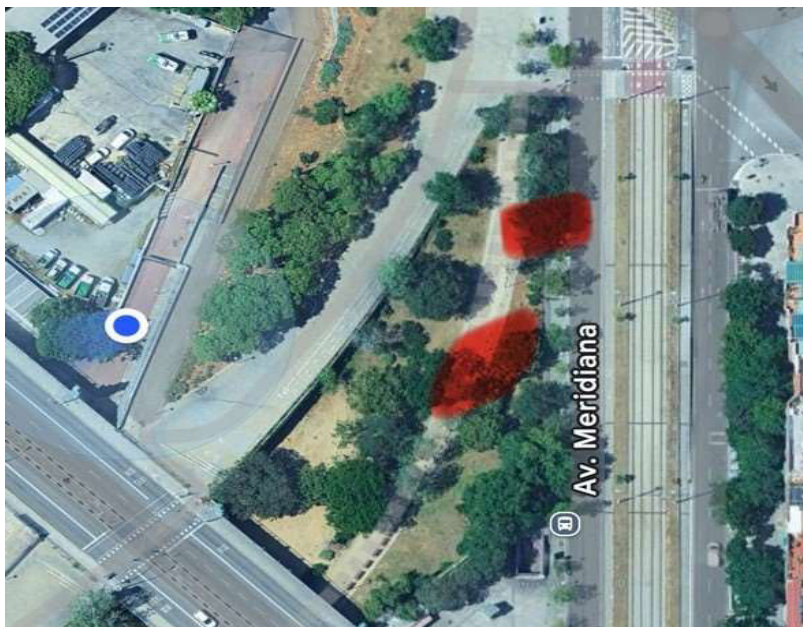

Hay dos zonas hormigonadas donde no hay puntos de anclaje.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Via Favència (Costat CMC) Fecha de ensayo/Testing data: 30/10/2024
--	--



Zona 1



Zona 2



Zona Inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS EIXAMPLE SANTS MONTJUIC - ESTACIO DEL NORD

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1 y 2	Ancoratge		FADERS		

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
-----------------	---------------	-------------------

ANCORATGES	CABLES I TERMINALS
Ancoratge extrem	Tensió
Ancoratge intermig	Oxidació
Oxidació	Deformació
Cargoleria	Absorbidor
	Guardacaps
	Casquets
	Brides certif
	Tensor

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Se localizan dos anclajes en mal estado y hay dos zonas hormigonadas donde no hay puntos de anclaje.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Parc de l'estació del Nord Fecha de ensayo/Testing data: 30/10/2024
--	---



Anclaje 1



Anclaje 2



Punto sin anclaje 1



Punto sin anclaje 2



Zona inspeccionada



NORCONTROL, S.L.U.

Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n

08193 Bellaterra (BCN)

Tf. 935672000 Ext.52620

FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE

I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS

Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona

Teléfono/Telephone: 900 226 226

Lugar del ensayo/Job site:

Caseta Jardineros (Canopia)

Fecha de ensayo/Testing data:

23/10/2024

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS FRONT LITORAL

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1	LINEA DE VIDA		PREVILINE	21 m APROX	

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig	OK	Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació	NO	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargoleria	OK	Absorbidor	NO	Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Se encuentran un retractil para subir la escalera de acceso al techo de la caseta y una línea de vida en el mismo.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Caseta Jardineros (Canopia) Fecha de ensayo/Testing data: 23/10/2024
--	---



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS FRONT LITORAL

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 2	RETRACTIL	4631	PREVILINE/WURTH	5 m	ene-19

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge




Se encuentran un retractil para subir la escalera de acceso al techo de la caseta y una línea de vida en el mismo.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Caseta Jardineros (Canopia) Fecha de ensayo/Testing data: 23/10/2024
--	--




Retractil

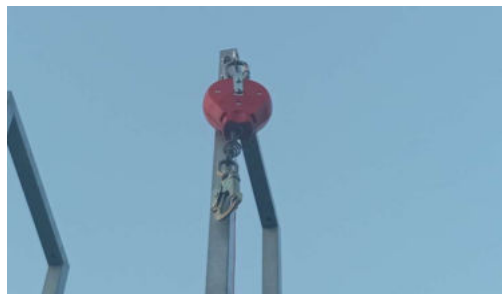


Retractil



Retractil

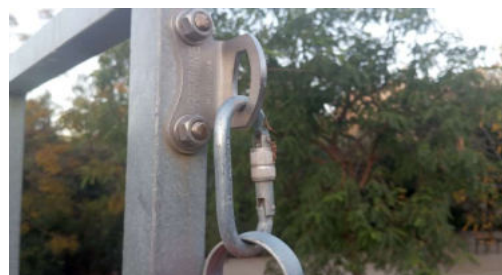

Retractil

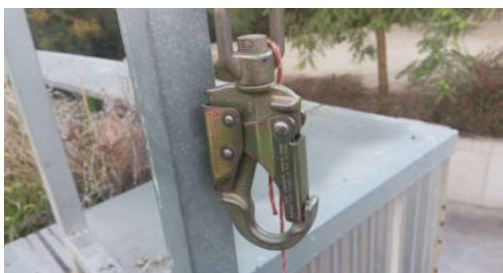

Retractil

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS FRONT LITORAL

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
1,2,3,4	ANCORATGE		FADERS		

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	---------------	-----------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	KO	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	SI	Deformació		Brides certif	
Cargolería	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	
------------------------------------	--

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

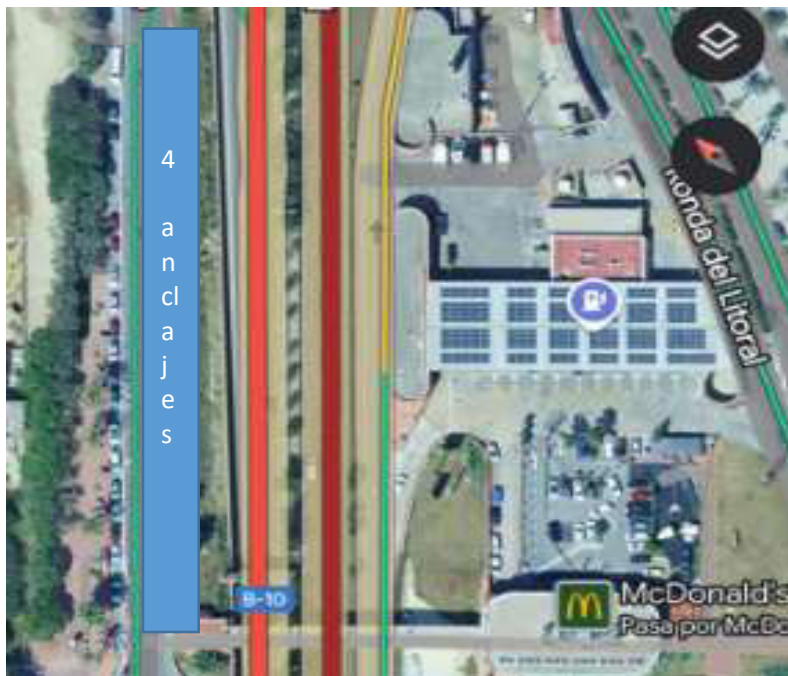

Se encuentran 4 puntos de anclaje a lo largo de la acera, habian mas pero han sido vandalizados y sustraídos. Los 4 restantes estan oxidados, y golpeados.


 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Salvador Espriu con Jaume Vicens Vives (Mc Donalds) Fecha de ensayo/Testing data: 23/10/2024
--	---



Anclaje 1




Anclaje 2

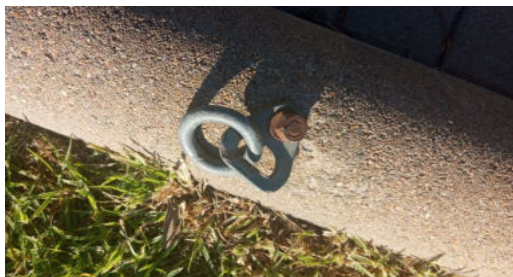


Anclaje 3



Anclaje 4

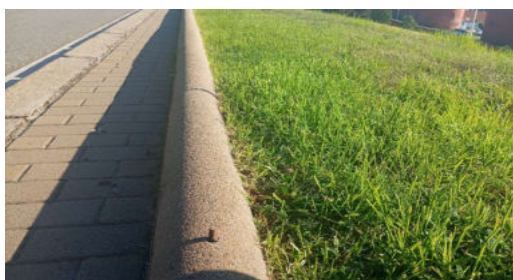

Anclaje sustraído

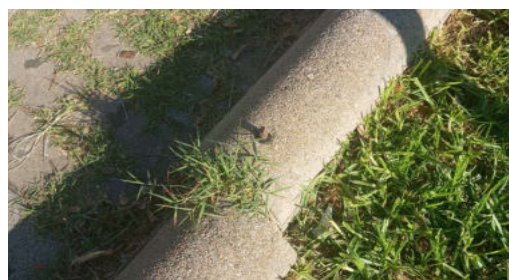

Anclaje sustraído



Zona inspeccionada



NORCONTROL, S.L.U.

Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n
08193 Bellaterra (BCN)
Tf. 935672000 Ext.52620

FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS

Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona

Teléfono/Telephone: 900 226 226

Lugar del ensayo/Job site:

C/ Feijoo con c/ Murtra

Fecha de ensayo/Testing data:

25/10/2024

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS GUINARDO

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
1,2,3,4,5,6	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ

TÈCNIC APPLUS

M.ANGEL CARDOSO

ANCORATGES

Ancoratge extrem

OK

Ancoratge intermig

Oxidació

SI

Cargoleria

OK

CABLES I TERMINALS

Tensió

Oxidació

Deformació

Absorbidor

Guardacaps

Casquets

Brides certif

Tensor

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió



El sistema inspeccionat és correcte.



El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.




El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.



No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

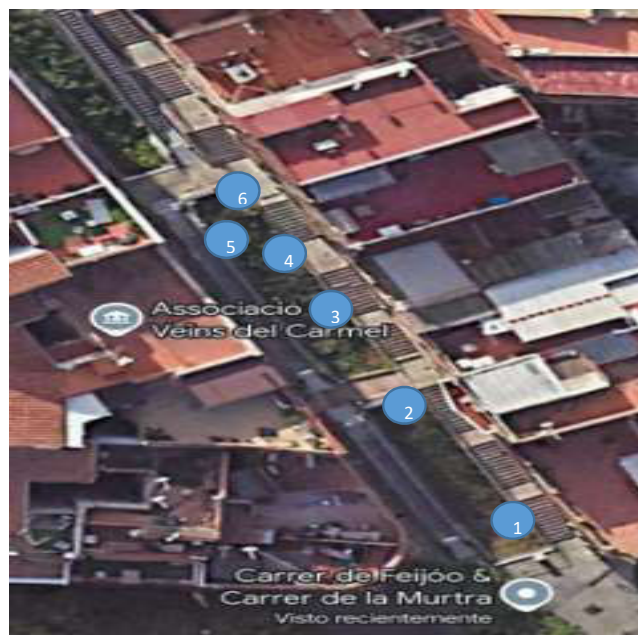

Los 6 anclajes son anillas ancladas a la pared ligeramnete oxidadas, no tienen ningun tipo de dato.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: C/ Feijoo con c/ Murtra Fecha de ensayo/Testing data: 25/10/2024
--	---



Anclaje numero 1



Anclaje numero 2



Anclaje numero 3



Anclaje numero 4



Anclaje numero 5



Anclaje numero 6

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS GUINARDO

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
7 y 8	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	SI	Deformació		Brides certif	
Cargolería	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	
------------------------------------	--

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

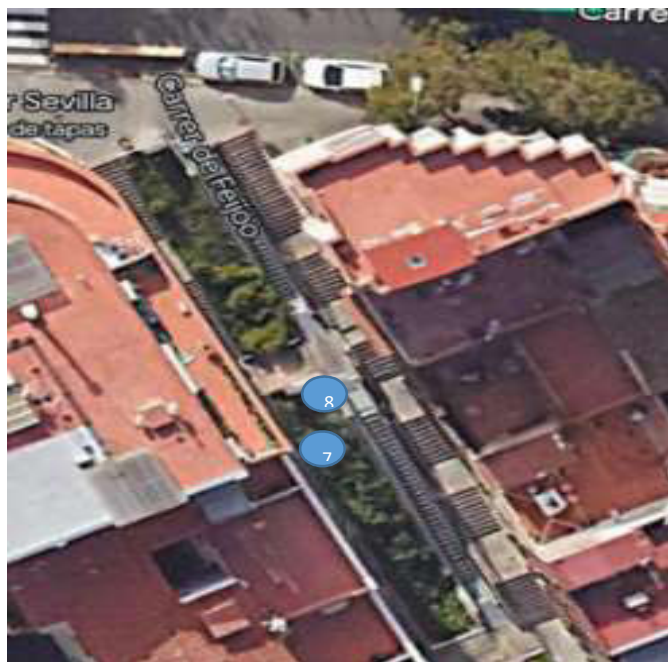

Los 2 anclajes son anillas ancladas a la pared ligeramnete oxidadas, no tienen ningun tipo de dato.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tlf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: C/ Feijoo con c/ Murtra Fecha de ensayo/Testing data: 25/10/2024
---	--



Anclaje numero 7



Anclaje numero 8



Zona Inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS GUINARDO

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
1,2,3,4,5,6	Ancoratge	PAF 180 12	PROTEKT		jul-20

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargolería	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	1
---	---

Conclusió


- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Los 6 anclajes son del mismo tipo, estan en buen estado pero no estan certificados.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: C/ Feijoo con c/ Murtra Fecha de ensayo/Testing data: 25/10/2024
--	--

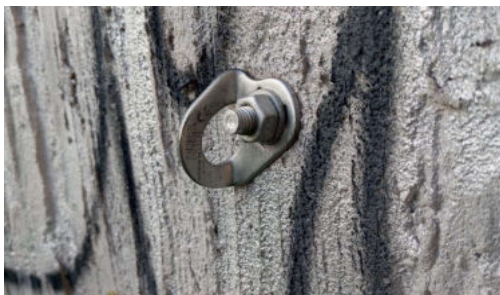


Anclaje numero 1



Anclaje numero 2




Anclaje numero 3

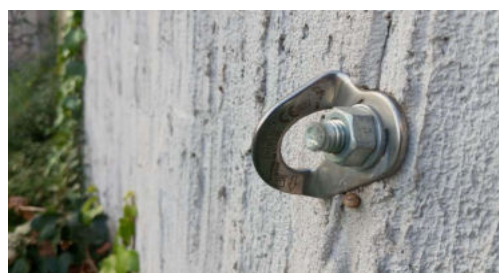

Anclaje numero 4



Anclaje numero 5

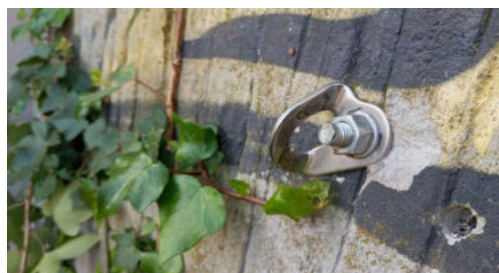

Anclaje numero 6



Zona tipo inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS GUINARDO

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº1	Linea de Vida			12 m APROX	

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig		Oxidació	NO	Casquets	NO
Oxidació	NO	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargolería	OK	Absorbidor	NO	Tensor	NO

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

☐

El sistema inspeccionat és correcte.

☐

El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.

☐

El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.

☐

No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



La línea de vida esta en buen estado, pero no dispone de nada de informacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: c/ Murtra i c/ Santuari (ZONA ASCENSOR) Fecha de ensayo/Testing data: 25/10/2024
--	---



Linea de Vida 1



Linea de Vida 1




Linea de Vida 1



Linea de Vida 1



Linea de Vida 1

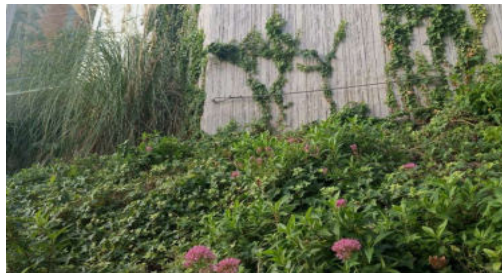

Linea de Vida 1

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS GUINARDO

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº2	Línea de Vida		SICURSAFE	6 m APROX	

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig		Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació	NO	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargolería	OK	Absorbidor	OK	Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

☐

El sistema inspeccionat és correcte.

☐

El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.

☐

El sistema inspeccionat no és correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.

☐

No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Caseta Jardineros (MAS RAVETLLAT) Fecha de ensayo/Testing data: 25/10/2024
--	---



Linea de Vida 2



Linea de Vida 2



Linea de Vida 2



Linea de Vida 2

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS GUINARDO

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº3	Linea de Vida		INNOTECH	30 m APROX	nov-19

DATA DE REVISIÓ	nov-20	TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--------	----------------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig	OK	Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació	NO	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargolería	OK	Absorbidor	OK	Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	4
---	---

Conclusió



El sistema inspeccionat és correcte.



El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.



El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.



No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Caseta Jardineros (MAS RAVETLLAT) Fecha de ensayo/Testing data: 25/10/2024
--	---



Linea de Vida 3



Linea de Vida 3



Linea de Vida 3



Linea de Vida 3



Linea de Vida 3



Linea de Vida 3

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS MONTBAU SANT GENIS

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1 a 10	Ancoratge		PETZL		

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
-----------------	---------------	-------------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Los diez anclajes son del mismo tipo y estan en buen estado, pero no tienen ninguna informacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Jardins Idumea Fecha de ensayo/Testing data: 29/10/2024
--	--



Ejemplo anclaje tipo



Ejemplo anclaje tipo



Zona inspeccionada



Zona inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS MONTBAU SANT GENIS

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1 al 13	Ancoratge	A0620 ??	FIXE		

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
------------------------	--	----------------------	-------------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	1
---	---

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Los 13 puntos de anclaje, son del mismo modelo y estan en buen estado, pero no tienen ningun tipo de informacion o certificacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Jardins Can Soler Fecha de ensayo/Testing data: 29/10/2024
--	---



Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo localizado



Zona tipo inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS MONTBAU SANT GENIS

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 14 al 29	Ancoratge	A0620 ??	FIXE		

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
-----------------	---------------	-------------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	1
------------------------------------	---

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Los 16 puntos de anclaje, son del mismo modelo y estan en buen estado, pero no tienen ningun tipo de informacion o certificacion. Excepto uno que es una anilla anclada en la pared. Sin informacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Jardins Can Soler Fecha de ensayo/Testing data: 29/10/2024
--	---



Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo localizado




Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo anilla localizado

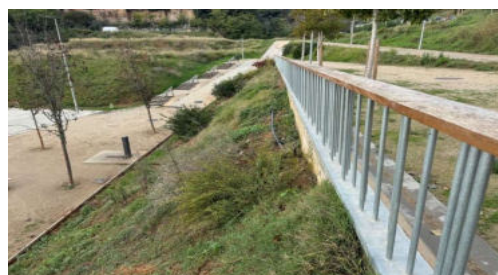

Zona tipo inspeccionada



Zona tipo inspeccionada



NORCONTROL, S.L.U.

Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n
08193 Bellaterra (BCN)
Tf. 935672000 Ext.52620

FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS

Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA
Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona
Teléfono/Telephone: 900 226 226
Lugar del ensayo/Job site: Jardins Constança
Fecha de ensayo/Testing data: 30/10/2024

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1 al 28	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
-----------------	---------------	-------------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	NO	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

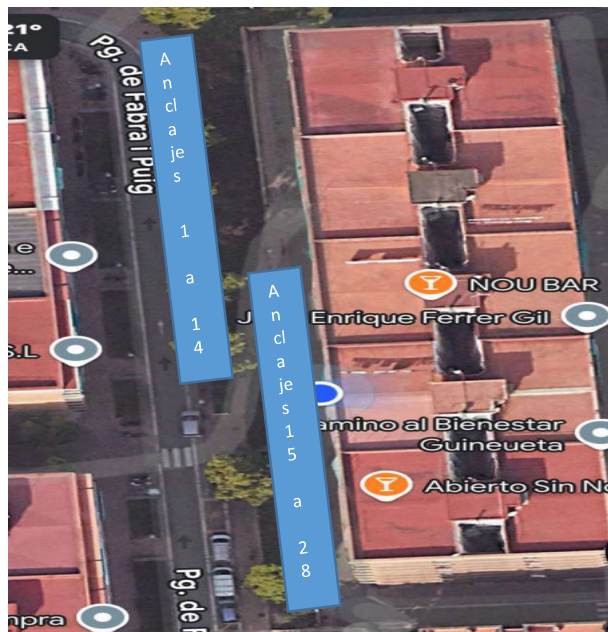

Los 28 puntos de anclaje son anillas soldadas al perímetro de la barandilla, no tienen ningún tipo de certificación e información, pero están en buen estado.


 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Jardins Constança Fecha de ensayo/Testing data: 30/10/2024
--	---




Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo localizado

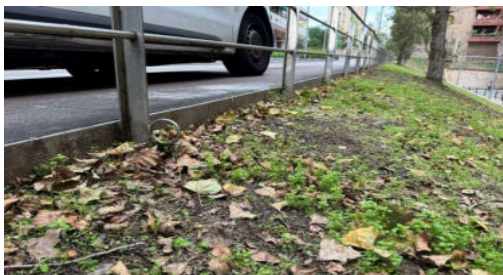

Zona inspeccionada

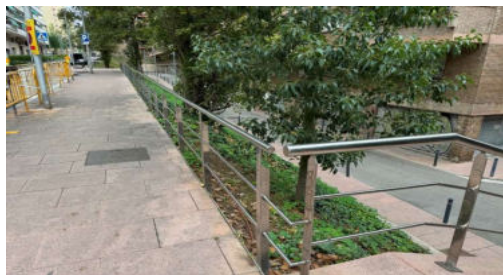

Zona inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº1	Línea de vida				

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
------------------------	--	----------------------	-------------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	NO	Guardacaps	NO
Ancoratge intermig		Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació	NO	Deformació	SI	Brides certif	NO
Cargolería	OK	Absorbidor	NO	Tensor	NO

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	
---	--

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

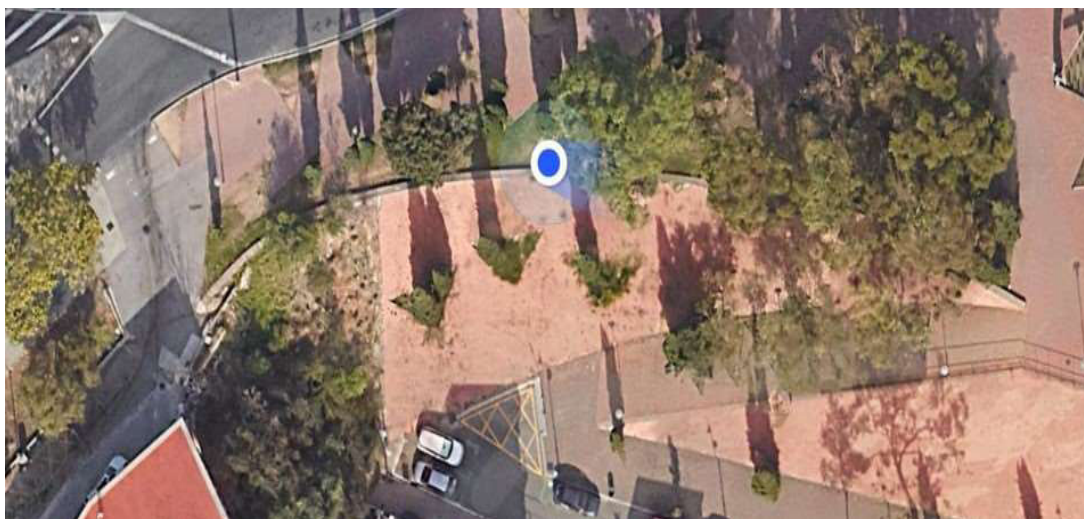

El sistema no esta homologado ni certificado.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: C/ Mont-ral (lateral Rda de Dalt) Fecha de ensayo/Testing data: 30/10/2024
--	---



Linea de Vida 1



Linea de Vida 1



Linea de Vida 1



Linea de Vida 1

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS PARC DE LA GUINEUETA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
1	Línea de Vida	6722	IRUDEK PRO9	44 m APOX	ene-20

DATA DE REVISIÓ	oct-24	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
------------------------	--------	----------------------	-------------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig	OK	Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació	OK	Deformació	NO	Brides certif	OK
Cargolería	OK	Absorbidor	OK	Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	2
---	---

Conclusió

- ☒ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

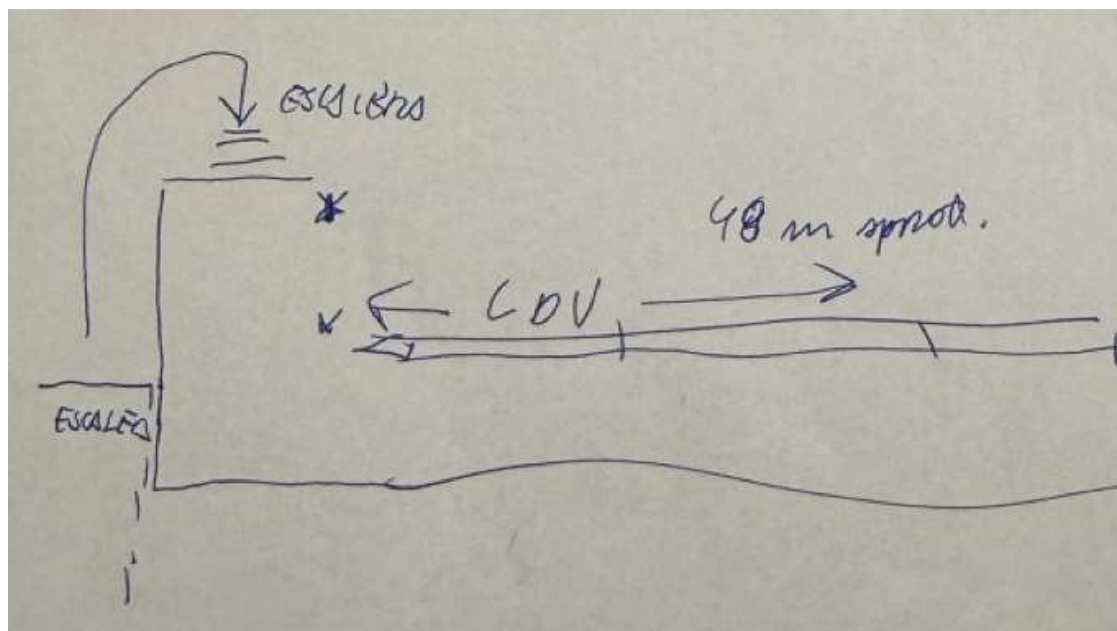

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Jardí Vertical (Costat caseta) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	--




Linea de vida 1



Linea de vida 1




Linea de vida 1

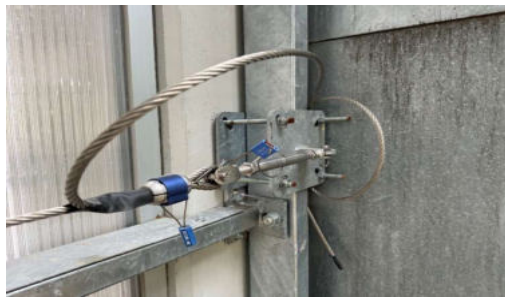


Linea de vida 1




Linea de vida 1

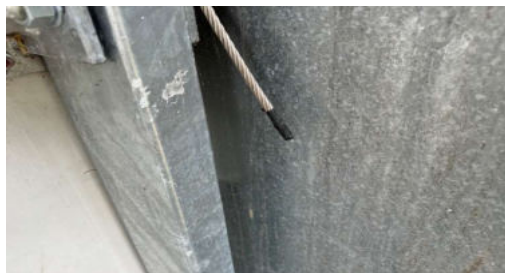

Linea de vida 1

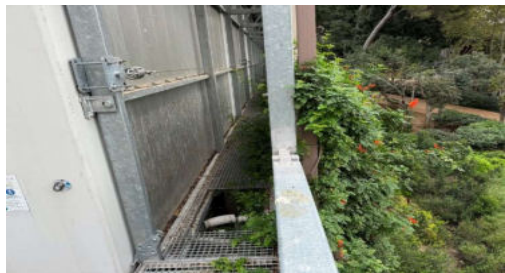

Linea de vida 1

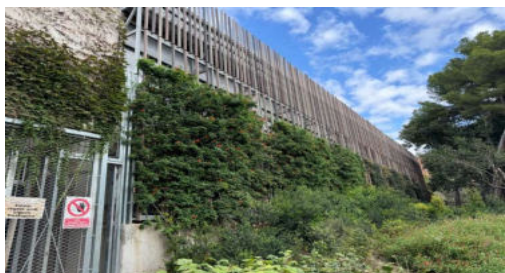

Linea de vida 1

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS PARC DE LA GUINEUETA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1, 2 y 3	Ancoratge		PETZL / ??		oct-23

DATA DE REVISIÓ	mar-24	TÈCNIC APPLUS	JACIONTO BENAVENTE
-----------------	--------	---------------	--------------------

ANCORATGES			CABLES I TERMINALS		
Ancoratge extrem		OK	Tensió		Guardacaps
Ancoratge intermig			Oxidació		Casquets
Oxidació		NO	Deformació		Brides certif
Cargoleria		OK	Absorbidor		Tensor

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió



El sistema inspeccionat és correcte.



El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.




El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.



No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

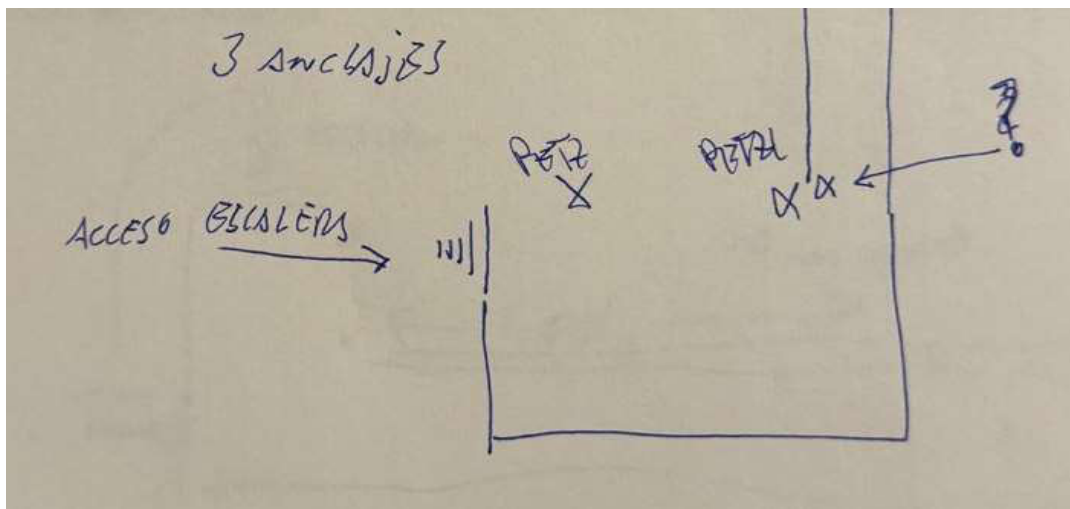

Se encuentran 3 anclajes en buen estado y revisados, dos de ellos son Marca PETZL, del tercero no hay datos.


 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Jardí Vertical (Costat caseta) Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Anclaje 1



Anclaje 2

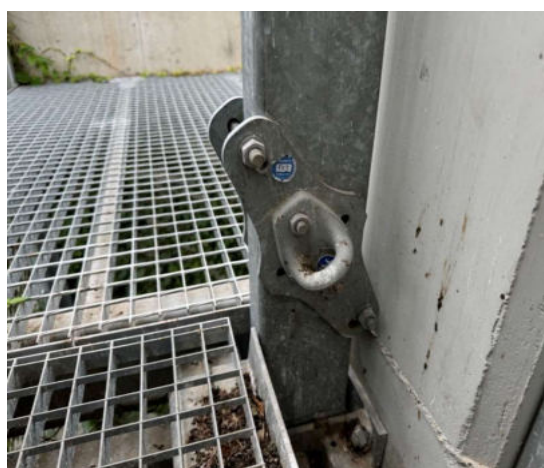

Anclaje 3

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS PARC ORENETA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
------------------------	--	----------------------	-------------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió


- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

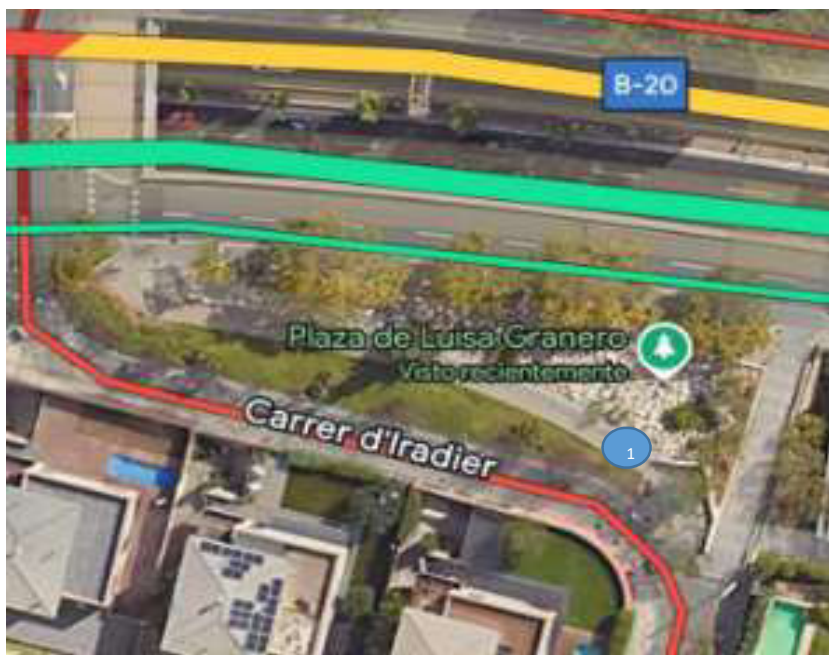

El anclaje esta en buen estado pero no presenta ningun tipo de informacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Rda de Dalt-Pomaret-Iraider Fecha de ensayo/Testing data: 28/10/2024
--	--

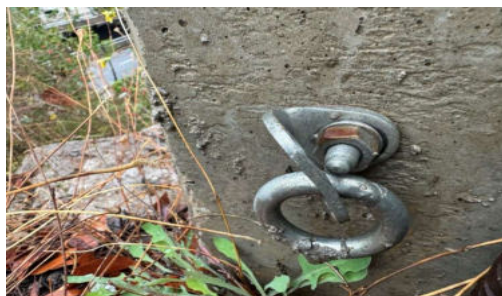

Anclaje numero 1



Anclaje numero 2

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS PARC ORENETA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 2,3 y 4	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
-----------------	---------------	-------------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	SI	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	NO	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Los tres anclajes son anillas incrustadas en el cemento y bastante oxidadas. No presentan ningun tipo de informacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Rda de Dalt-Pomaret-Iraider Fecha de ensayo/Testing data: 28/10/2024
--	--



Anclaje numero 2



Anclaje numero 2



Anclaje numero 3



Anclaje numero 4

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS PARK GÜEL

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº1	Linea de vida			45 m APROX	

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS
	M.ANGEL CARDOSO


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig	OK	Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació	NO	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargoleria	OK	Absorbidor	OK	Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

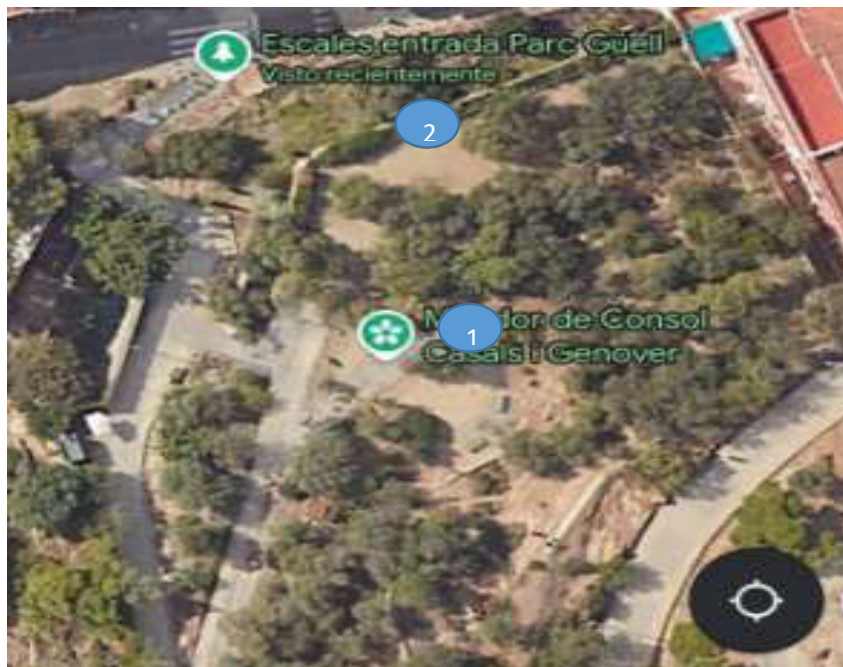

La linea de vida se encuentra en buen estado pero no hay informacion sobre la misma.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Mirador de la baixada de Gloria Fecha de ensayo/Testing data: 28/10/2024
--	---



Linea de Vida Numero 1



Linea de Vida Numero 1



Linea de Vida Numero 1



Linea de Vida Numero 1



Linea de Vida Numero 1



Zona inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS PARK GÜELL

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº2	Línea de Vida			34 m APROX	

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig	OK	Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació	NO	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargolería	OK	Absorbidor	OK	Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

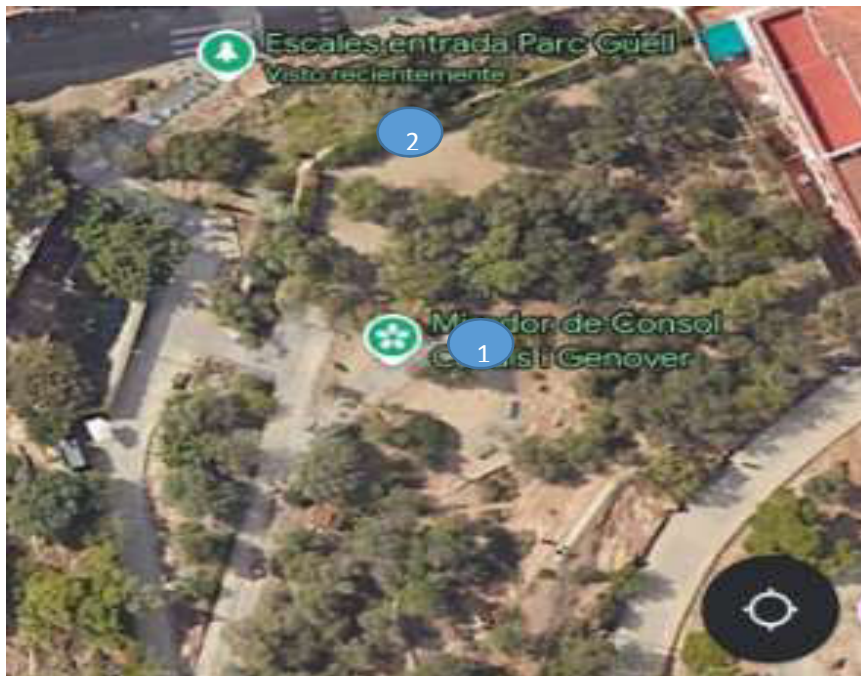

La línea de vida se encuentra en buen estado pero no hay información sobre la misma.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Baixada de la Gloria- Coll del Portell Fecha de ensayo/Testing data: 28/10/2024
--	--



Linea de Vida Numero 2



Linea de Vida Numero 2



Linea de Vida Numero 2



Linea de Vida Numero 2



Linea de Vida Numero 2



Linea de Vida Numero 2



Linea de Vida Numero 2

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (linia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS PLA DE FORNELLS

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1 a 13	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ

TÈCNIC APPLUS

JACINTO BENAVENTE

ANCORATGES

CABLES I TERMINALS

Ancoratge extrem	KO	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	SI	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	KO	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

☐

El sistema inspeccionat és correcte.

☐

El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.


☒

El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.

☐

No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

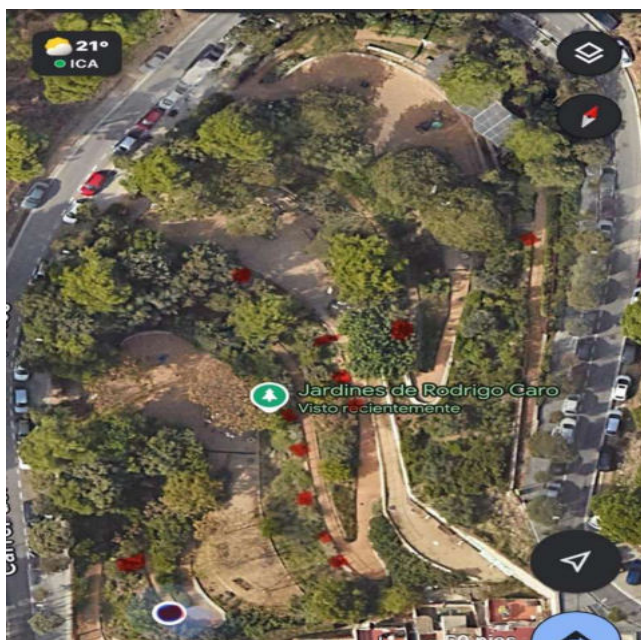

Los anclajes (puntos rojos del mapa) estan colocados en barandillas que estan sueltas, invalidando su funcionalidad.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Parque Rodrigo Caro (TODOS LOS PARTERRES) Fecha de ensayo/Testing data: 31/10/2024
--	---



Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo localizado



Zona tipo inspeccionada



Zona tipo inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS CANYELLES PROSPERTITAT

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1 a 8			FADERS		

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
------------------------	--	----------------------	-------------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem		Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	SI	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	KO	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

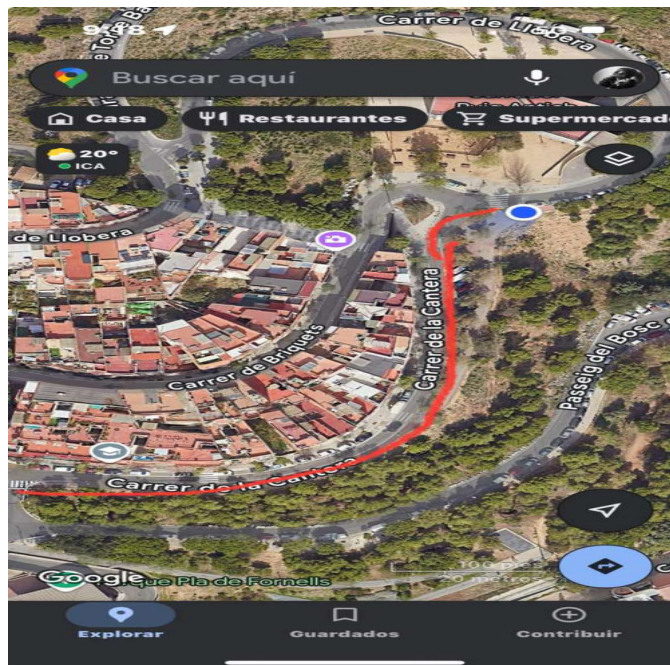

Se encuentran 8 anclajes en mal estado y 6 sustraídos a lo largo de la calle.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Carretera Forestal- Passeig del Bosc Fecha de ensayo/Testing data: 31/10/2024
--	--



Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo sustraído



Zona tipo inspeccionada



Zona tipo inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS CANYELLES PROSPERTITAT

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1 a 3			FADERS		

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS
	JACINTO BENAVENTE


ANCORATGES	CABLES I TERMINALS
Ancoratge extrem	Tensió
Ancoratge intermig	Oxidació
Oxidació	Deformació
Cargoleria	Absorbidor
	Guardacaps
	Casquets
	Brides certif
	Tensor

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

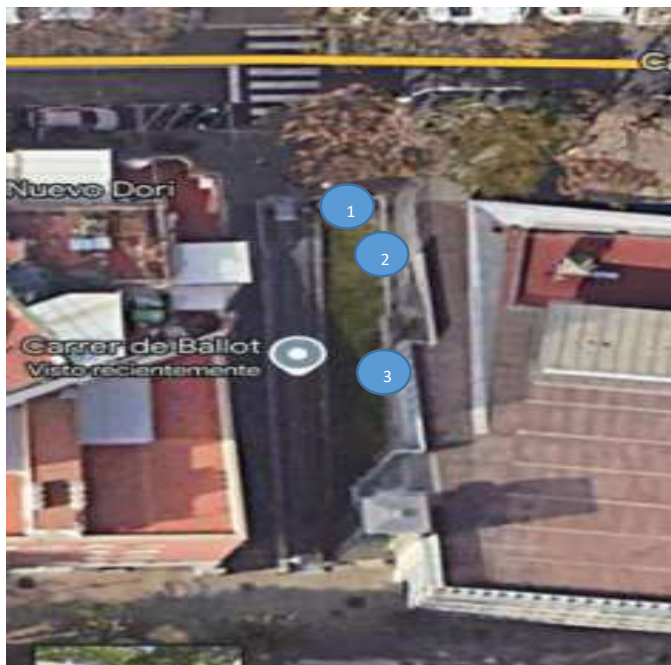

Se encuentran 3 anclajes, en mal estado, sin informacion ni certificacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: De Ballot - Mina de la Ciutat (escales) Fecha de ensayo/Testing data: 31/10/2024
--	--



Anclaje numero 1



Anclaje numero 1



Anclaje numero 2




Anclaje numero 2



Anclaje numero 3



Anclaje numero 3

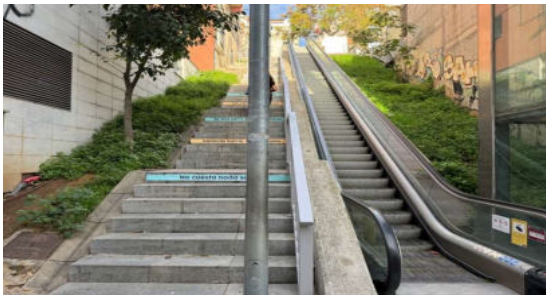

Zona inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS CANYELLES PROSPERTITAT

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1 a 6					

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
-----------------	---------------	-------------------


ANCORATGES	CABLES I TERMINALS
Ancoratge extrem	Tensió
Ancoratge intermig	Oxidació
Oxidació	Deformació
Cargoleria	Absorbidor
	Guardacaps
	Casquets
	Brides certif
	Tensor

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

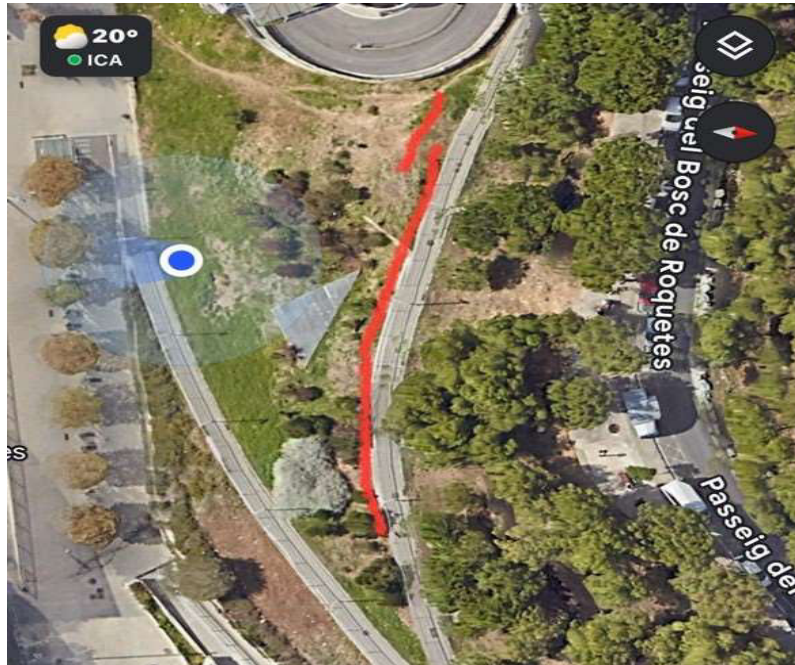

Se encuentran 6 anclajes, en mal estado, sin informacion ni certificacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Plaça Roquetes (Costat Parquing) Fecha de ensayo/Testing data: 31/10/2024
--	--



Anclaje tipo localizado



Anclaje tipo localizado



Zona inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS CANYELLES PROSPERTITAT

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1 y 2			FADERS		

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
-----------------	---------------	-------------------


ANCORATGES	CABLES I TERMINALS
Ancoratge extrem	Tensió
Ancoratge intermig	Oxidació
Oxidació	Deformació
Cargoleria	Absorbidor
	Guardacaps
	Casquets
	Brides certif
	Tensor

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

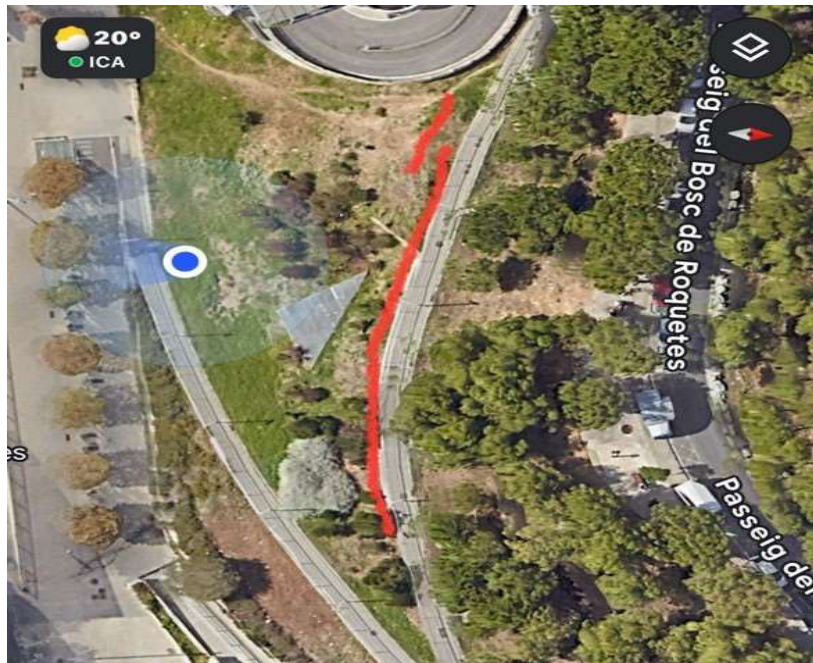


Se encuentran 2 anclajes a lo largo del cemento del zocalo, en mal estado, sin informacion ni certificacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensay: Passeig del Bosc (Cami superior parking) Fecha de ensayo/Testing data: 31/10/2024
--	---



Anclaje numero 1

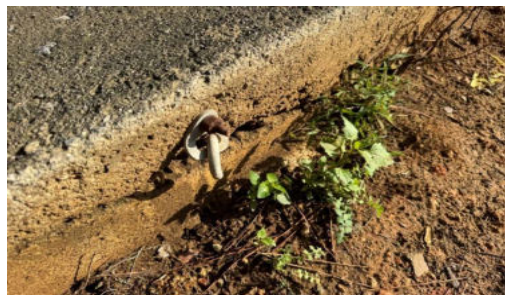

Anclaje numero 2



Zona inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS PUTXET

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1 y 2	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
------------------------	--	----------------------	-------------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargolería	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	
---	--

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Los 2 anclajes estan en buen estado pero no presentan nada de informacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: C/ CLAUDI SABADELL-REPUBLICA ARGENTINA Fecha de ensayo/Testing data: 28/10/2024
--	---



Anclaje numero 1



Anclaje numero 2



Zona inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS TAMARITA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1 y 2	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
-----------------	---------------	-------------------


ANCORATGES			CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem		OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig			Oxidació		Casquets	
Oxidació		SI	Deformació		Brides certif	
Cargolería		OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

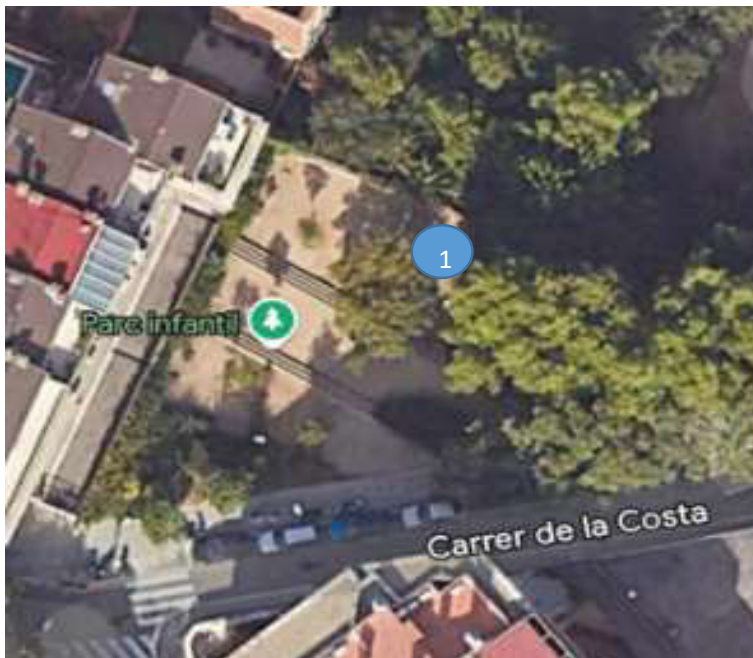

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Jardins M.Rodoreda (pl. c/ de la costa) Fecha de ensayo/Testing data: 28/10/2024
--	--



Anclaje numero 1



Zona inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS TURO DE LA PEIRA

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
1 a 11	Linea de Vida	0305-18	PREVILINE		ago-18

DATA DE REVISIÓ	feb-23	TÈCNIC APPLUS	JACINTO BENAVENTE
------------------------	--------	----------------------	-------------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig	OK	Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació	NO	Deformació	NO	Brides certif	OK
Cargoleria	OK	Absorbidor	OK	Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

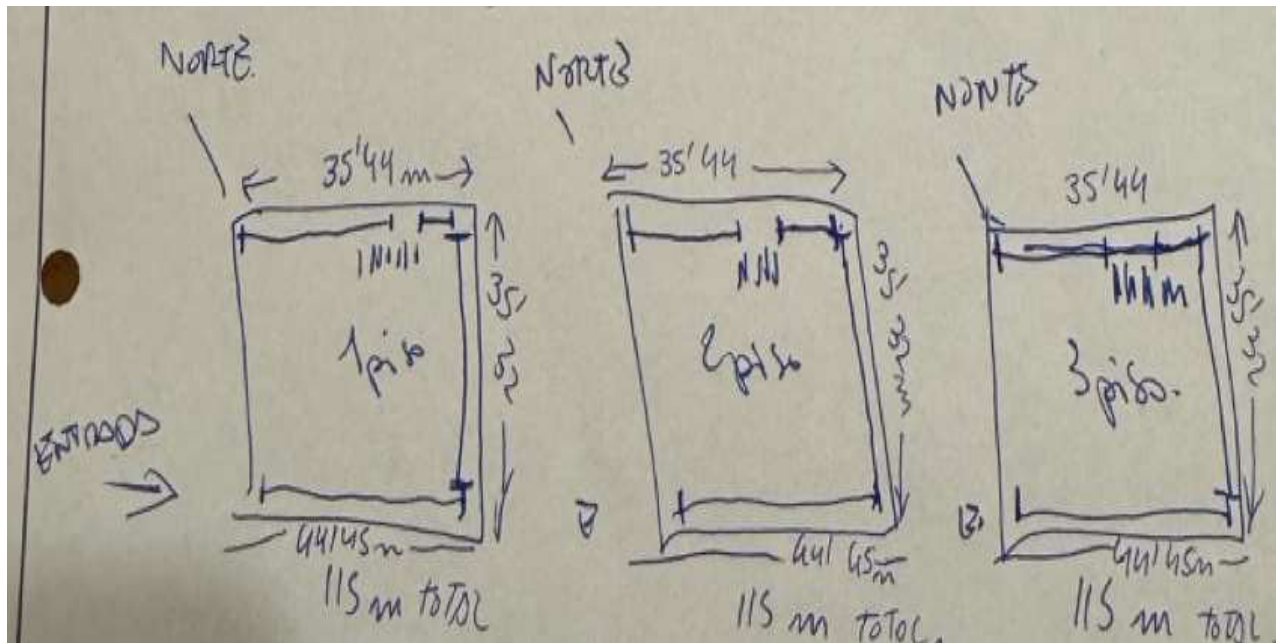


Es un conjunto de 11 líneas de vida, estan en buen estado, faltaria la revision anual.


 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Pl i Molist Jordi Vertical Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
---	---




Linea de vida

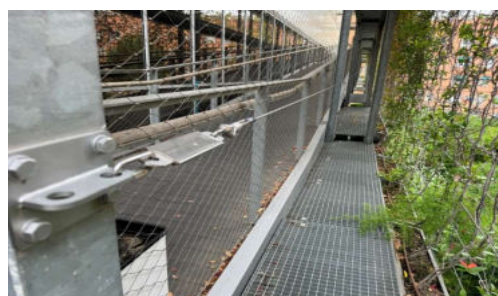


Linea de vida

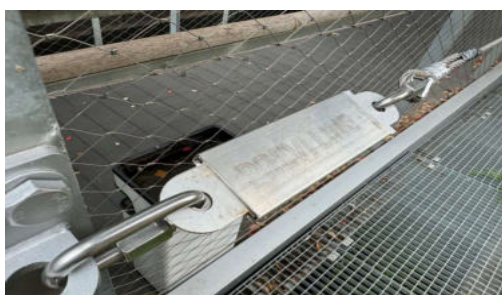


Linea de vida

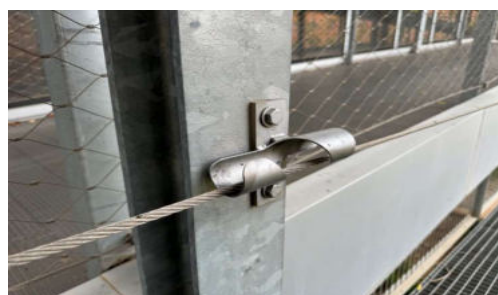


Linea de vida

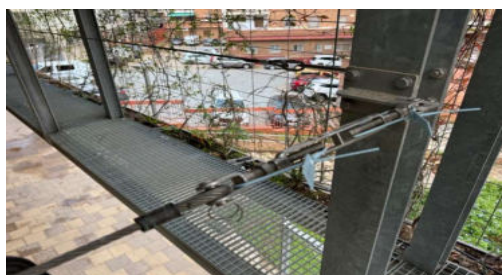


Linea de vida

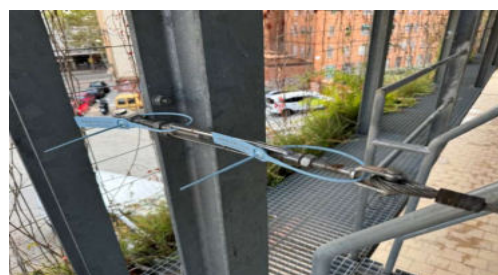


Linea de vida

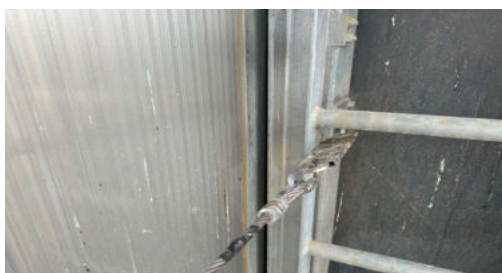

Linea de vida

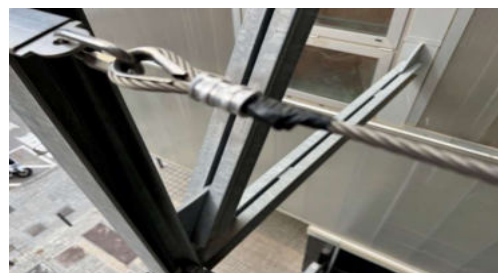

Linea de vida

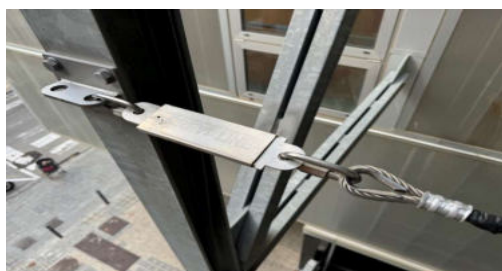

Linea de vida



Linea de vida

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS VALL D'HEBRON

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
1	Ancoratge	1002005000 11	IRUDEK PRO9	--	ago-18

DATA DE REVISIÓ	---	TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	-----	----------------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Mare de deu dels Angels 101, 104 Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Anclaje 1



Anclaje 1

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS VALL D'HEBRON

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
2,3,4	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	---------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	?	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



Los tres anclajes se encuentran pintados y no se aprecia ninguna información sobre ellos. Al estar cubiertos de pintura no se aprecia el estado del propio anclaje a nivel de oxidación.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Mare de deu dels Angels 101, 104 Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Anclaje numero 2



Anclaje numero 2



Anclaje numero 3



Anclaje numero 3



Anclaje numero 4



Anclaje numero 4



NORCONTROL, S.L.U.

Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n

08193 Bellaterra (BCN)

Tf. 935672000 Ext.52620

FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE

I/O LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS

Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona

Teléfono/Telephone: 900 226 226

Lugar del ensayo/Job site:

Escales dels Canadencs

Fecha de ensayo/Testing data:

21/10/2024

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS VALL D'HEBRON

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1	Ancoratge	1002005000 11	IRUDEK PRO9		ago-18

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
-----------------	--	---------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO*	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



* La arandela de la tornilleria esta ligeramente oxidada.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Escales dels Canadencs Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Anclaje numero 1



Anclaje numero 1

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS VALL D'HEBRON

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 2 Y 3	Ancoratge	1002005000 11	IRUDEK PRO9		ene-19

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	M.ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	-----------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargolería	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA	
---	--

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge




Los anclajes 2 y 3 son el mismo modelo y los mismos datos, en el mismo estado.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Escales dels Canadencs Fecha de ensayo/Testing data: 21/10/2024
--	---



Anclaje numero 2 y 3

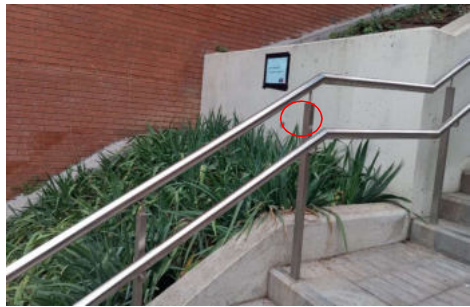

Anclaje numero 2



Anclaje numero 3

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS ZONA PARC DE LES AIGÜES DEL GUINARDO

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1 a 6	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	MIGUEL ANGEL CARDOSO
-----------------	---------------	----------------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	NO	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

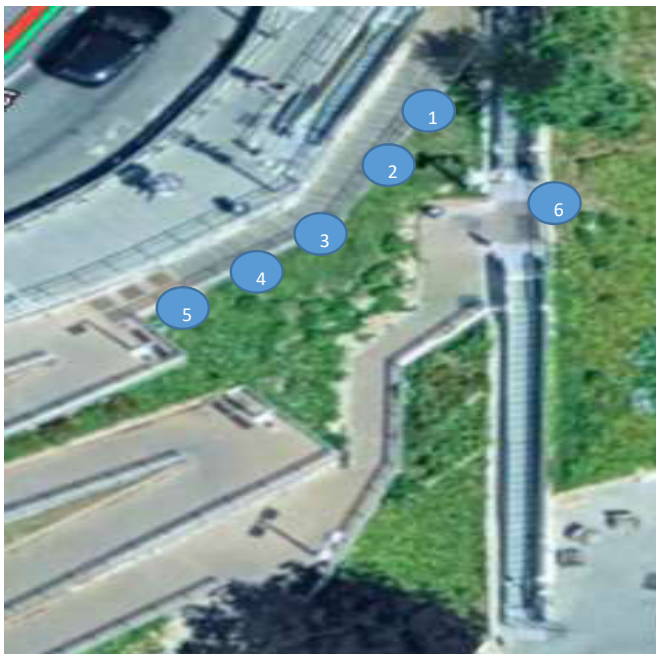

Lso 6 puntos de anclaje son del mismo tipo, no tienen ningun tipo de referencia ni certificacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Plaça Ramon Casellas con c/ Josep Millan Gonzalez Fecha de ensayo/Testing data: 29/10/2024
--	---



Anclaje 1



Anclaje 2




Anclaje 3



Anclaje 4




Anclaje 5

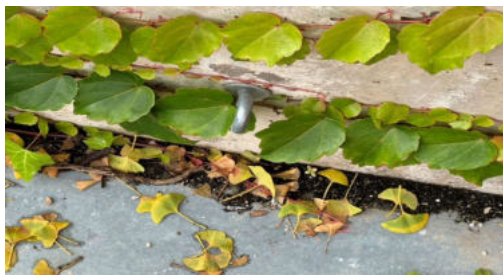

Anclaje 6



Zona inspeccionada

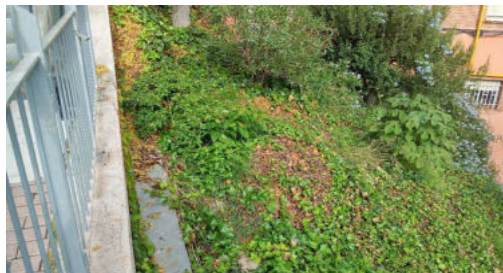

Zona inspeccionada

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS ZONA PARC DE LES AIGÜES DEL GUINARDO

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1	Linea de Vida		FALLPROTECT	60 m APROX	

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	MIGUEL ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	----------------------

ANCORATGES			CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem		OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig		OK	Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació		LIGERA	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargoleria		OK	Absorbidor	OK	Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



La línea de vida se encuentra en buen estado pero en la placa de información no se aprecia ningún dato visible.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Parc de Pla i Armengol Fecha de ensayo/Testing data: 29/10/2024
--	--



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1



Linea de vida 1

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS ZONA PARC DE LES AIGÜES DEL GUINARDO

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 2	Linea de Vida		FALLPROTECT	16 m APROX	

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	MIGUEL ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	----------------------

ANCORATGES			CABLES I TERMINALS		
Ancoratge extrem	OK	Tensió	OK	Guardacaps	OK
Ancoratge intermig	OK	Oxidació	NO	Casquets	OK
Oxidació	LIGERA	Deformació	NO	Brides certif	NO
Cargoleria	OK	Absorbidor	OK	Tensor	OK

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



La línea de vida se encuentra en buen estado pero en la placa de información no se aprecia ningún dato visible.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Parc de Pla i Armengol Fecha de ensayo/Testing data: 29/10/2024
--	--



Linea de vida 2



Linea de vida 2



Linea de vida 2



Linea de vida 2



Linea de vida 2

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS ZONA PARC DE LES AIGÜES DEL GUINARDO

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1, 2 y 3	Ancoratge				

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	MIGUEL ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	----------------------


ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	NO	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	NO	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge

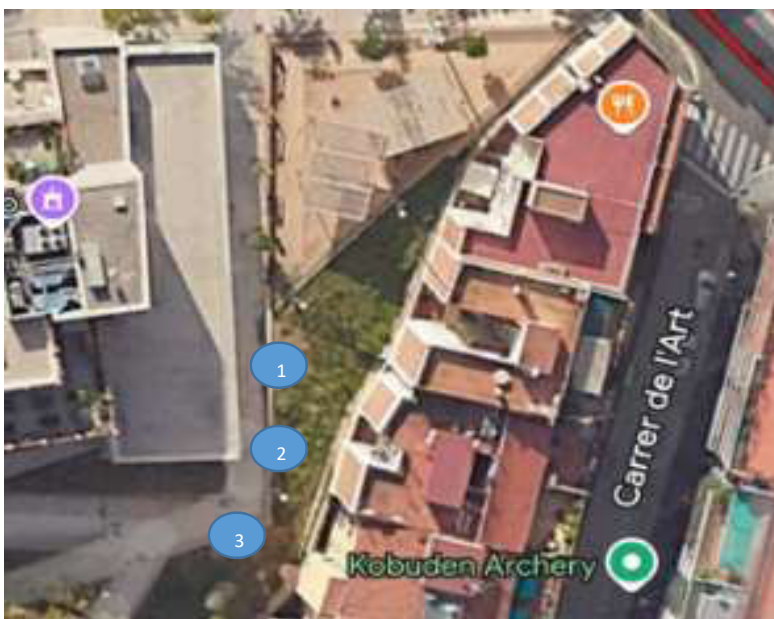

Los tres puntos de anclaje son iguales, estan en buen estado pero no tienen ningun tipo de informacion ni certificacion.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gracia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Jardins Frederica Montseny Fecha de ensayo/Testing data: 29/10/2024
--	---



Anclaje 1



Anclaje 2



Anclaje 3

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS ZONA PARC DE LES AIGÜES DEL GUINARDO

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1	Linea de Vida				

DATA DE REVISIÓ		TÈCNIC APPLUS	MIGUEL ANGEL CARDOSO
------------------------	--	----------------------	----------------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	KO	Tensió	KO	Guardacaps	NO
Ancoratge intermig	KO	Oxidació	SI	Casquets	NO
Oxidació	SI	Deformació	SI	Brides certif	NO
Cargoleria	KO	Absorbidor	NO	Tensor	NO

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☐ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☒ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge



La línea de vida esta vandalizada rota por un extremo, totalmente inservible.

 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: Jardins Hiroshima Fecha de ensayo/Testing data: 29/10/2024
--	---



Linea de Vida 1



Linea de Vida 1



Linea de Vida 1

UNE 795 TIPUS A1 (ancoratges fixes) i tipus C (línia d'ancoratge flexible horitzontal)

TALUSSOS ZONA PARC DE LES AIGÜES DEL GUINARDO

NUM	TIPUS	REFERÈNCIA	MARCA	LONGITUD	INSTAL·LACIÓ
Nº 1, 2 y 3	Ancoratge		FADERS		

DATA DE REVISIÓ	TÈCNIC APPLUS	MIGUEL ANGEL CARDOSO
-----------------	---------------	----------------------

ANCORATGES		CABLES I TERMINALS			
Ancoratge extrem	OK	Tensió		Guardacaps	
Ancoratge intermig		Oxidació		Casquets	
Oxidació	LIGERA	Deformació		Brides certif	
Cargoleria	OK	Absorbidor		Tensor	

NÚMERO D'USUARIS MÀXIM DEL SISTEMA

Conclusió

- ☐ El sistema inspeccionat és correcte.
- ☒ El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- ☐ El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- ☐ No es troba o no existeix la instal·lació.

Croquis d'ubicació del dispositiu d'ancoratge




Los cuatro puntos de anclaje son iguales, estan en buen estado pero no tienen ningun tipo de informacion ni certificacion. El anclaje 4 tiene la tornilleria oxidada.


 NORCONTROL, S.L.U. Campus UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (BCN) Tf. 935672000 Ext.52620	FITXA D'INSPECCIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I/O LÍNIES DE VIDA HORIZONTALS Client/Customer: INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA Direcció/Address: Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 220, Gràcia, 08012 Barcelona Teléfono/Telephone: 900 226 226 Lugar del ensayo/Job site: c/ Telegraf Fecha de ensayo/Testing data: 29/10/2024
--	---



Anclaje 1

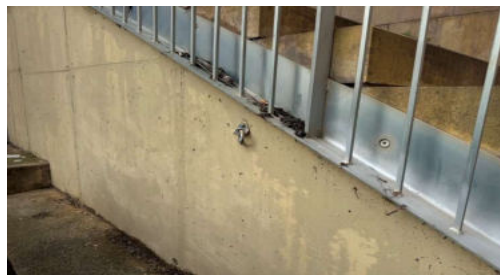


Anclaje 1

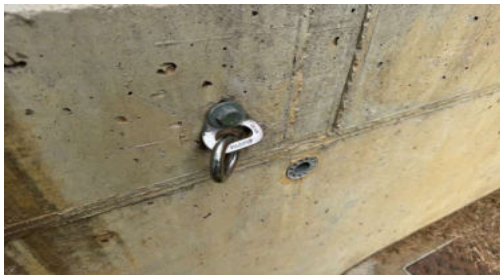

Anclaje 2



Anclaje 2

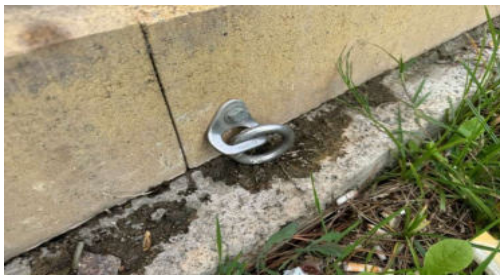

Anclaje 3



Anclaje 3



Anclaje 4



Anclaje 4



VALORACIÓ ECONÒMICA REPOSICIÓ/SUSTITUCIÓ ELEMENTS D'ANCORATGE.-
PARCS I JARDINS_AJUNTAMENT DE BARCELONA

NOVEMBRE 2024.-

A continuació es llisten els punts inspeccionats separant-los en dos grups, un amb el total de lineas de vida inspeccionades (24) i un altre grup on s'assenyalen tots els punts d'ancoratge (338), trobats i analitzats. Els imports reflexats en euros, acaben conforman el Pressupost d'execució material, que caldria per tal de retornar els elements inspeccionats a un estat correcte de conservació.

CODI	TIPUS	REFERENCIA/FABRICANT	UBICACIO	Long. (mts)	ESTAT	IMPORT (euros)
LV-01	L.V.	85010-00 QA11H9	RDA LITORAL E.24 (LADO MAR)	75,00	B	750,00
LV-02	L.V.	?	PARC CENTRAL POBLE NOU (Pou del Mon)	15,00	C	1500,00
LV-03	L.V.	?	PARC CENTRAL POBLE NOU (Pou del Mon)	30,00	C	3000,00
LV-04	L.V.	?	PARC CENTRAL POBLE NOU (Pou del Mon)	25,00	C	2500,00
LV-05	L.V.	?	PARC CENTRAL POBLE NOU (Pou del Mon)	45,00	C	4500,00
LV-06	L.V.	PREVILINE	Bon pastor. Camp del Ferro	50,00	B	750,00
LV-07	L.V.	H-XTENDA(LACHWAY)	Av Meridiana-Pg Santa Coloma	180,00	B	750,00
LV-08	L.V.	?	c/ Miguel Hernandez con Federico Garcia Lorca	36,00	B	750,00
LV-09	L.V.	ID 1357342 (GM)	Castell de Montjuic (MERLET 1)	28,00	B	750,00
LV-10	L.V.	(PROLINE)	Castell de Montjuic (MERLET 1)	36,00	C	3600,00
LV-11	L.V.	1002/22 PREVILINE	Balconeras Biblioteca CIUTAT MERIDIANA	46,00	B	750,00
LV-12	L.V.	1002/22 PREVILINE	Balconeras Biblioteca CIUTAT MERIDIANA	18,00	B	750,00
LV-13	L.V.	1002/22 PREVILINE	Terraza Biblioteca CIUTAT MERIDIANA	42,00	B	750,00
LV-14	L.V.	PREVILINE	Caseta Jardineros (Canopia) Talussos Front Litoral	21,00	B	750,00
LV-15	L.V.	?	c/ Murtra i c/ Santuari (ZONA ASCENSOR)	12,00	B	750,00
LV-16	L.V.	SICURSAFE	Caseta Jardineros (MAS RAVETLLAT)/GUINARDO	6,00	B	750,00
LV-17	L.V.	INNOTECH	Caseta Jardineros (MAS RAVETLLAT)/GUINARDO	30,00	B	750,00
LV-18	L.V.	?	C/ Mont-ral (lateral Rda de Dalt)PARC CENTRAL NOU BARRIS	15,00	C	1500,00
LV-19	L.V.	6722 IRUDEK PRO9	Jardi Vertical (Costat caseta)PARC GUINEUETA	44,00	A	0,00
LV-20	L.V.	?	Mirador de la baixada de Gloria PARC GUELL	45,00	B	750,00
LV-21	L.V.	?	Baixada de la Gloria- Coll del Portell PARC GUELL	34,00	B	750,00
LV-22	L.V.	0305-18 PREVILINE	PI i Molist Jardi Vertical TURO DE LA PEIRA	45,00	B	750,00
LV-23	L.V.	FALLPROTECT	Parc de Pla i Armengol PARC DE LES AIGUES	60,00	B	750,00
LV-24	L.V.	?	PARC DE LES AIGUES. Jardins Hiroshima	Es desconeix	C	500,00

TOTAL L.V. 29100,00

PUNTS D'ANCORATGE

ANC-25	8	FADERS	TALUSSOS CANYELLES PROSPERITAT. c/ Miguel Hernandez con Federico Garcia Lorca		C	800,00
ANC-26	2	FADERS	CASTELL MONTJUIC (MERLET 1 FACHADA PRINCIPAL DERECHA PUERTA CASTILLO)		B	200,00
ANC-27	2	FADERS	CASTELL MONTJUIC (MERLET 1 FACHADA PRINCIPAL DERECHA PUERTA CASTILLO)		C	200,00
ANC-28	2	PROTEKT PAF180 12	CASTELL MONTJUIC (MERLET 1 FACHADA PRINCIPAL IZQUIERDA PUERTA CASTILLO)		B	200,00
ANC-29	1	?	CASTELL MONTJUIC (MERLET 1 FACHADA PRINCIPAL PUERTA CASTILLO)		D	100,00
ANC-30	1	FIXE	CASTELL MONTJUIC (MERLET 1 FACHADA PRINCIPAL PUERTA CASTILLO)		B	100,00
ANC-31	1	G.M.D. TS16415:2013	CASTELL MONTJUIC (MERLET 2 DERECHA PUERTA CASTILLO)		B	100,00
ANC-32	2	FADERS	CASTELL MONTJUIC (MERLET 2 DERECHA PUERTA CASTILLO)		C	200,00
ANC-33	3	PAF180 12	CASTELL MONTJUIC (MERLET 2 DERECHA PUERTA CASTILLO)		B	300,00
ANC-34	1	G.M.D. TS164115:2013	CASTELL MONTJUIC (MERLET 2 DERECHA PUERTA CASTILLO)		B	100,00
ANC-35	3	?	CASTELL MONTJUIC (MERLET 2 IZQUIERDA PUERTA CASTILLO)		C	300,00
ANC-36	1	FADERS	CASTELL MONTJUIC (MERLET 2 IZQUIERDA PUERTA CASTILLO)		C	100,00
ANC-37	0	?	CASTELL MONTJUIC (MERLET 3 FRONTAL HASTA BALUARTE DE SANTA AMALIA)		D	0,00
ANC-38	5	FADERS	CASTELL MONTJUIC (MERLETS 4 FOSSAT SANTA EULALIA)		C	500,00
ANC-39	0	?	CASTELL MONTJUIC (MERLETS 5 BALUARD DE SANTA AMALIA)		D	0,00
ANC-40	9	FADERS	CASTELL MONTJUIC (MERLETS 6 TIR AMB ARC)		C	900,00
ANC-41	0	?	CASTELL MONTJUIC (MERLET 7 DARRERA OFICINES)		D	0,00
ANC-42	0	?	CASTELL MONTJUIC (MERLET 8 JARDINS DARRERA OFICINES)		D	0,00
ANC-43	5	?	CIUTAT MERIDIANA. C/Agudes -C/Costabona (escales)		C	500,00
ANC-44	6	?	CIUTAT MERIDIANA. C/Agudes -C/Costabona (escales)		C	600,00
ANC-45	9	WURTH	CIUTAT MERIDIANA. Parterres Rasos de Peguera (1)		B	900,00
ANC-46	11	WURTH	CIUTAT MERIDIANA. Parterres Rasos de Peguera (2)		B	1100,00
ANC-47	25	?	CIUTAT MERIDIANA. Parterres Rasos de Peguera (3)		B	2500,00
ANC-48	14	?	CIUTAT MERIDIANA. Parterres Rasos de Peguera (4)		B	1400,00
ANC-49	9	?	TALUSSOS CREUETA DEL COLL. Mare de deu dels Angels (TEIXONERA)		B	900,00
ANC-50	21	FALLPROTECT LDV029	TALUSSOS CREUETA DEL COLL. Mare de deu dels Angels (TEIXONERA)		A	2100,00
ANC-51	7	FADERS	TALUSSOS EIXAMPLE SANTS MONTJUIC - ANELLA OLIMPICA. C/ Jocs del 92 (Baseball)		C	700,00
ANC-52	5	PEX AFX	TALUSSOS EIXAMPLE SANTS MONTJUIC - ANELLA OLIMPICA. FCC Alts Forns (La vinya) CAMPO DAMM		B	500,00
ANC-53	4	?	TALUSSOS EIXAMPLE SANTS MONTJUIC - ANELLA OLIMPICA. FCC Plaça Teresa Claramunt		B	400,00
ANC-54	4	?	TALUSSOS EIXAMPLE SANTS MONTJUIC - ANELLA OLIMPICA. FCC Plaça Teresa Claramunt		B	400,00
ANC-55	2	?	TALUSSOS EIXAMPLE SANTS MONTJUIC - ESTACIO DEL NORD. Via Favencia (Costat CMC)		D	200,00
ANC-56	2	?	TALUSSOS EIXAMPLE SANTS MONTJUIC - ESTACIO DEL NORD. Via Favencia (Costat CMC)		C	200,00
ANC-57	6	?	TALUSSOS GUINARDO. C/ Feijoo con c/ Murtra		B	600,00
ANC-58	2	?	TALUSSOS GUINARDO. C/ Feijoo con c/ Murtra		B	200,00
ANC-59	6	PROTEKT PAF180 12	TALUSSOS GUINARDO. C/ Feijoo con c/ Murtra		B	600,00

ANC-60	10	PETZL	TALUSSOS MONTBAU SANT GENIS. Jardins Idumea		B	1000,00
ANC-61	13	FIXE A0620	TALUSSOS MONTBAU SANT GENIS. JARDINS CAN SOLER		B	1300,00
ANC-62	16	FIXE A0620	TALUSSOS MONTBAU SANT GENIS. JARDINS CAN SOLER		B	1600,00
ANC-63	28	?	TALUSSOS PARC CENTRAL DE NOU BARRIS. JARDINS CONSTANCIA		B	2800,00
ANC-64	3	PETZL	TALUSSOS VALL D'HEBRON. Mare de deu dels Angels 101, 104		A	300,00
ANC-65	1	?	TALUSSOS PARC ORENETA. Rda de Dalt-Pomaret-Iraider		B	100,00
ANC-66	3	?	TALUSSOS PARC ORENETA. Rda de Dalt-Pomaret-Iraider		C	300,00
ANC-67	13	?	TALUSSOS PLA DE FORNELLS. Parque Rodrigo Caro (TODOS LOS PARTERRES)		C	1300,00
ANC-68	8	FADERS	TALUSSOS PLA DE FORNELLS. Carretera Forestal- Passeig del Bosc		C	800,00
ANC-69	3	FADERS	TALUSSOS PLA DE FORNELLS. De Ballot - Mina de la Ciutat (escales)		C	300,00
ANC-70	6	?	TALUSSOS PLA DE FORNELLS. Plaça Roquetes (Costat Parquing)		C	600,00
ANC-71	2	FADERS	TALUSSOS PLA DE FORNELLS. Passeig del Bosc (Cami superior parquing)		C	200,00
ANC-72	2	?	TALUSSOS PUTXET. C/ CLAUDI SABADELL-REPUBLICA ARGENTINA		B	200,00
ANC-73	2	?	TALUSSOS TAMARITA. Jardins M.Rodoreda (pl. c/ de la costa)		B	200,00
ANC-74	1	IRUDEK PRO9 100200500	TALUSSOS VALL D'HEBRON. Mare de deu dels Angels 101, 104		B	100,00
ANC-75	3	?	TALUSSOS VALL D'HEBRON. Mare de deu dels Angels 101, 104		B	300,00
ANC-76	1	IRUDEK PRO9 100200500	TALUSSOS VALL D'HEBRON. Escales dels Canadencs		B	100,00
ANC-77	2	IRUDEK PRO9 100200500	TALUSSOS VALL D'HEBRON. Escales dels Canadencs		B	200,00
ANC-78	6	?	TALUSSOS ZONA PARC DE LES AIGÜES DEL GUINARDO. Plaça Ramon Casellas con c/ Josep Millan Gonzalez		B	600,00
ANC-79	3	?	TALUSSOS ZONA PARC DE LES AIGÜES DEL GUINARDO. JARDINS FREDERICA MONTSENY		B	300,00
ANC-80	3	FADERS	TALUSSOS ZONA PARC DE LES AIGÜES DEL GUINARDO. C/ TELEGRAF		B	300,00
ANC-81	4	FADERS	TALUSSOS FRONT LITORAL. Salvador Espriu-Jaume Vicenç Vives		B	400,00
ANC-82	6	?	TALUSSOS BON PASTOR TRINITAT. Av Meridiana-Ctra Ribes		B	600,00
ANC-83	2	?	TALUSSOS BON PASTOR TRINITAT. Av Meridiana-Ctra Ribes. Lado Besòs		B	200,00
ANC-84	18	FADERS	TALUSSOS BON PASTOR TRINITAT. Plaça de la Primavera		B	1800,00

338

TOTAL ANCOR

33800,00

LLEGENDA ESTAT

TOTAL

62900,00

- A El sistema inspeccionat és correcte.
- B El sistema inspeccionat és correcte, però manca el certificat de revisió anual.
- C El sistema inspeccionat no es correcte per obsolet o per degradació important i s'ha de reparar o substituir.
- D No es troba o no existeix la instal·lació.

El Pressupost d'execució material, que caldria per tal de retornar els elements inspeccionats a un estat correcte de conservació, ascendeix a SISANTA DOS MIL NOUCENTS EUROS, (62.900,00).

Bellaterra, a 9 de Gener de 2025

Tècnic redactor

Josep Miquel Cabezos Morro, Arquitecte Tècnic
