


22 de febrer de 2022

Substitució de les màquines interiors de climatització i tancament de la sala CPD de Casagran de l'IMI, amb mesures de contractació sostenible.

A. DUBTES REBUTS PER CORREU ELECTRÒNIC

- 1) Necesitamos saber los **metros totales de las nuevas acometidas eléctricas de las mangueras libre de halógenos 5x6 mm²** para cada unidad interior de refrigeración.
Se consideran unos 80 ml.
- 2) Se necesita saber el **diámetro de las tuberías de impulsión y retorno de agua del circuito de condensación**, de las unidades de interior a reemplazar.
Se consideran tuberías InoxPress 35x1mm FABRICADES AMB INOX-304.
- 3) Se necesita saber el diámetro de las **tuberías del gas**, de las unidades de interior a reemplazar con a la actual unidad exterior que no se reemplaza Uniflair RAL1000.
2"= 50 mm.
- 4) Sobre los **cerramientos** [...] entendemos que desean cerrar el pasillo, [...], para tapar el espacio dejado a continuación del Rack11 hasta el final del pasillo. [...].
Se considera óptimo colocar la puerta de acceso entre los racks 00 y 07, dejando la parte entre racks 06 y rack 11 cerrada.

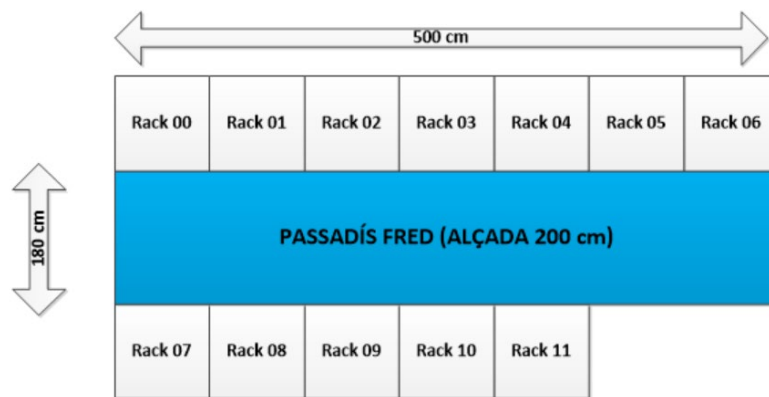

- 5) Solicitamos una ampliación de plazo de recepción de ofertas.
Por requerimientos técnicos y de servicio de la sala no se pueden aplazar las fechas propuestas.
